

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

ACTA INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: **MAURICIO PEDROZA CANIZALES**

B. CARGO: **GERENTE**

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): **AMABLE E.I.C.E**

D. CIUDAD Y FECHA: **ARMENIA, 25 DE ENERO DE 2016**

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: **21 ENERO DE 2014 COMO SUBGERENTE, 18 DE JUNIO DE 2015 COMO GERENTE**

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: **EMPALME POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN**

G. FECHA DE RETIRO: **RATIFICADO EN EL CARGO DE GERENTE**

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

JUNTAS DIRECTIVAS REALIZADAS

JUNTA DIRECTIVA No. 001: 13 de enero de 2012
JUNTA DIRECTIVA No. 002: 08 de febrero de 2012
JUNTA DIRECTIVA No. 003: 08 de marzo de 2012
JUNTA DIRECTIVA No. 004: 18 de mayo de 2012
JUNTA DIRECTIVA No. 005: 19 de julio de 2012
JUNTA DIRECTIVA No. 006: 26 de octubre de 2012
JUNTA DIRECTIVA No. 007: 12 de diciembre de 2012
JUNTA DIRECTIVA No. 001: 31 de enero de 2013
JUNTA DIRECTIVA No. 002: 02 de mayo de 2013
JUNTA DIRECTIVA No. 003: 25 de julio de 2013
JUNTA DIRECTIVA No. 004: 22 de agosto de 2013
JUNTA DIRECTIVA No. 005: 18 de septiembre 2013
JUNTA DIRECTIVA No. 006: 11 de diciembre 2013
JUNTA DIRECTIVA No. 001: 28 de febrero 2014
JUNTA DIRECTIVA No. 002: 22 de mayo 2014
JUNTA DIRECTIVA No. 003: 16 de julio 2014
JUNTA DIRECTIVA No. 004: 18 de septiembre 2014
JUNTA DIRECTIVA No. 005: 25 de noviembre 2014
JUNTA DIRECTIVA No. 001: 20 de marzo 2015
JUNTA DIRECTIVA No. 002: 17 de junio 2015
JUNTA DIRECTIVA No. 003: 16 de septiembre 2015
JUNTA DIRECTIVA No. 004 VIRTUAL: 29 diciembre 2015

REUNIONES REALIZADAS

REUNIÓN 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012

El 19 de septiembre de 2012, se asistió a la ciudad de Bogotá a reunión con miembros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con el Ministerio de Transporte, con el fin de presentar ante los designados el Plan de Adquisiciones y POA de AMABLE EICE ente gestor Armenia del proyecto SETP, para su revisión y aprobación, al igual que la aprobación del primer desembolso por parte de la Nación por valor de \$11.909.000.000.oo.

REUNIÓN 10 DE OCTUBRE DE 2012

Se solicitó audiencia ante los Ministerios de hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Transporte el 10 de octubre de 2012 en la ciudad de Bogotá, para clarificar y socializar sobre la urgencia de la transferencia de los Recursos por parte de Nación, según flujo de caja requerido a Diciembre, el cual no alcanzaba los valores ni siquiera para cubrir el desembolso de la transferencia vigencia 2011; en esta reunión con el Ministerio de Transporte se concretó desembolso por los 20 mil millones contando con el flujo de caja hasta marzo de 2013 con obras

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

ejecutadas con presupuesto de vigencia 2012.

REUNIÓN 29 DE OCTUBRE DE 2012

Asistencia a reunión en el Ministerio de Transporte con el fin de realizar seguimiento al proyecto y al cronograma de desembolsos previstos de los recursos de la Nación para las vigencias 2011 y 2012; por lo tanto, se hizo presentación del Plan de Adquisiciones y del POA, realizándole seguimiento para determinar las fechas y valores estimados de desembolsos.

REUNIÓN 27 DE NOVIEMBRE DE 2012

Asistencia a reunión de trabajo programada en las instalaciones del Departamento Nacional de Planeación, con el fin de adelantar gestiones para la suscripción del Otrosí al convenio de Cofinanciación entre la Nación y el Municipio de Armenia para el proyecto SETP y verificar el cumplimiento de las certificaciones que soportan los aportes del Municipio de Armenia.

COMITÉS FIDUCIARIOS – FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

COMITÉ FIDUCIARIO: 28 de febrero de 2012

Se presentó el informe financiero por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre de 2012, según el Contrato de encargo Fiduciario No. 001 de 2010; igualmente se verificaron las tareas que estaban pendientes del anterior comité.

COMITÉ FIDUCIARIO: 31 de agosto de 2012

Se presentó el informe financiero por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. correspondiente al trimestre Enero – Marzo y Abril - Junio de 2012, según el Contrato de encargo Fiduciario No. 001 de 2010; igualmente se verificaron las tareas que estaban pendientes del anterior comité.

COMITÉ FIDUCIARIO: 9 de noviembre de 2012

Se presentó el informe financiero por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. correspondiente al trimestre Julio - Septiembre de 2012, según el Contrato de encargo Fiduciario No. 001 de 2010; igualmente se verificaron las tareas que estaban pendientes del anterior comité.

COMITÉ FIDUCIARIO: 25 de abril de 2013

Se presentó el informe financiero por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. correspondiente al trimestre Octubre - Diciembre de 2012, según el Contrato de encargo Fiduciario No. 001 de 2010; igualmente se verificaron las tareas que estaban pendientes del anterior comité.

COMITÉ FIDUCIARIO: 17 de junio de 2013

Se presentó el informe financiero por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. correspondiente al trimestre Enero - Marzo de 2013 y se trató el tema relacionado Baja rentabilidad y comportamiento de las carteras colectivas, según el Contrato

de encargo Fiduciario No. 001 de 2010; igualmente se verificaron las tareas que estaban pendientes del anterior comité.

COMITÉ FIDUCIARIO: 17 de junio de 2013

Se presentó el informe financiero por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. correspondiente al trimestre Enero - Marzo de 2013 y se trató el tema relacionado Baja rentabilidad y comportamiento de las carteras colectivas, según el Contrato de encargo Fiduciario No. 001 de 2010; igualmente se verificaron las tareas que estaban pendientes del anterior comité.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA FIDUCIARIA: 19 de julio de 2013

Se trataron los siguientes temas:

- Análisis Macroeconómico: El Dr. Jorge Enrique Cortes (Gerente Inversiones Fiduoccidente S.A.) explica la relación precio – mercado (rentabilidad) y su efecto en la valoración a precios de mercado en los instrumentos de inversión, valoración que es obligatoria para las entidades oficiales y financieras.

Prosigue informando que la situación económica en Estados Unidos tiene efectos en los mercados mundialmente; desde Mayo de 2013 se presentó un alza atípica que produjo como efecto el alza en los precios de los papeles. Esta fue una situación que afectó no solamente a las Carteras Colectivas de las Sociedades Fiduciarias, sino también afectó inversiones de las Sociedades de Pensiones y Cesantías y en general a todo el sistema financiero Colombiano y de América Latina.

Históricamente la última vez que el Sistema se enfrentó a una situación similar fue en el año 2002, siendo la actual crisis más profunda que aquella.

- Evolución del Mercado desde Mayo de 2013 a la fecha: El Dr. Ortiz (Gerente Comercial Nacional Fiducia de Inversión, Fiduoccidente S.A.) presenta la información de cada una de las Carteras Colectivas Occitrosos de los negocios de Amable y Megabus, información que es suministrada en físico a los asistentes. En esta información se aprecia que la rentabilidad negativa de las CCA durante los meses de Mayo y Junio a la fecha de la presente reunión está siendo prácticamente cubierta por la rentabilidad positiva generada en el transcurso del mes de Julio.
- Situación financiera de los encargos fiduciarios de los proyectos: El Dr. Ortiz (Gerente Comercial Nacional Fiducia de Inversión, Fiduoccidente S.A.) reitera que durante la vigencia 2012 la rentabilidad acumulada en cada uno de los Occitrosos de los encargos fiduciarios Megabus y Amable es

positiva; si se analiza tanto en forma consolidada por encargo fiduciario como por fuente de financiación de cada uno de los encargos, la rentabilidad de los recursos administrados durante la vigencia 2012 igualmente es positiva.

En razón a que los rendimientos generados por los recursos aportados por la Nación son devueltos mensualmente al Tesoro Nacional, la rentabilidad negativa de los meses de mayo y junio/13 afectó el capital invertido por lo que sugiere que con los resultados positivos en rentabilidad se cubra la disminución de capital; presenta el Dr. Edgar John Jairo Carvajal el Decreto 630/96 del Ministerio de Hacienda donde se expresa que los rendimientos de la Nación deben “consignarse mensualmente tres (3) días después de la liquidación”. Bajo estas dos premisas se procederá a hacer el análisis de la sugerencia presentada con los jurídicos de la Fiduciaria y los expertos de los Ministerios.

El Dr. Ortiz acota que el Artículo 57 del Decreto 1552 expresa que las entidades estatales no pueden liquidar ó vender papeles a pérdida con excepción de los recursos invertidos en Cartera Colectivas Abiertas a las Sociedades Fiduciarias, caso en el cual la liquidación esta sujeta a los reglamentos de la CCA. Por consiguiente, agrega el Dr. Ortiz, para la Fiduciaria de Occidente S.A. con la rentabilidad negativa de los meses de Mayo y Junio no se incurrió en detrimento patrimonial y la disminución de capital a la fecha es una pérdida meramente contable y no ha sido materializada.

El Dr. Cortes manifiesta que los recursos de la Cartera Colectiva Occidentales se han enfocado en la reducción de la duración de los portafolios para mitigar el impacto que ocasiona la volatilidad de las inversiones y la rentabilidad ha empezado a estabilizarse; pregunta la Dra. Carmen Elisa Londoño Z. sobre los recursos de la fuente de financiación de apartes de Armenia a Amable, pueden subirse a la CCA abierta en el encargo? La respuesta es que por ahora se lleve a la cuenta de ahorros que se está aperturando para tal fin, mientras que se garantice la estabilidad de las CCA.

La Dra. Diana Sánchez de Amable hace reclamación sobre respuesta a solicitud de información de junio 12/13 que no ha sido atendida, a lo que la Dra. Londoño le responde que dicha respuesta se dio en correo electrónico enviado en junio 13/13 a ella y a los miembros del Comité Fiduciario delegados de los Ministerios.

La Dra. Lucy Norelly informa que Megabus también recibió correo electrónico en junio 13/13 en donde se explicaba por parte de la Fiduciaria la situación actual y el histórico de rentabilidades y saldos de las Carteras a

Mayo 31/13. Igualmente hace entrega de oficio con fecha julio 18/13 solicitando ampliación de la información.

COMITÉ FIDUCIARIO: 23 de agosto de 2013

Se presentara el informe financiero por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. correspondiente al trimestre Abril - Junio de 2013 y se tratará nuevamente el tema relacionado rentabilidad y comportamiento de las carteras colectivas, según el Contrato de encargo Fiduciario No. 001 de 2010; igualmente se verificarán las tareas que estaban pendientes del anterior comité.

COMITÉ FIDUCIARIO: 30 de julio de 2014

Se hace presentación de las cifras de los rendimientos por fuente de financiación a junio 30 de 2014 y de las carteras colectivas y cuenta de ahorro a julio 29 de 2014; el dr. Carvajal Solicita que las comunicaciones por parte de Amable a la Fiduciaria en relación con las rentabilidades negativas y sus respuestas sean anexadas a la presenta Acta.

El Dr. Carvajal solicita por parte de la Fiduciaria un comunicado en el cual se explique la metodología con la cual de definió el cambio en el tratamiento de los rendimientos que se devuelven a la Nación , ya que manifiesta que aún sigue vigente el traslado durante los primeros cinco días del mes, por lo cual se estaría incumpliendo con esta directriz de la dirección del tesoro nacional.

El Comité solicita a la fiduciaria hacer llegar de manera escrita la norma en la cual se basa el traslado parcial de los rendimientos, ya que no se está haciendo en su totalidad desde febrero del presente año.

En cuanto a los rendimientos negativos como menor valor de los aportes realizado en la contabilidad del encargo, el dr, Carvajal plantea que sea reversado, porque la recomendación del Comité Fiduciario es sobre el registro de las rentabilidades negativas en la contabilidad del ente Gestor.

COMITÉ FIDUCIARIO: 20 de noviembre de 2014

Se da lectura general a las cifras de informe por parte de la Dra. Cardona, los miembros del comité hacen las siguientes observaciones:

- .Aclarar que los descuentos por pagar correspondan al movimiento de septiembre de 2014.
- Corregir la información del ando anterior subtotal otros aportes ente gestor que esta por \$150.065.572.6 siendo \$316.985.063.60 para un total de pagos por aportes de \$33.557.008.051.36 y no \$31.703.834.821.36.
- Corregir la fecha corresponde a septiembre de 2014 y no de 2013.

El Dr. Carvajal manifiesta la importancia de que la información este conciliada por parte del ente gestor con la información suministrada por la Fiducia.

Se revisa la información de los aportes realizados por el Municipio de Armenia frente a lo presupuestado.

La rendición de cuentas queda revisada y pendiente de aprobación para el próximo comité, por falta de quorum.

Se hace la presentación de cifras de los Rendimientos por fuente de financiación acumulados a septiembre 30 de 2014 y del saldo de las carteras y cuentas de ahorros a noviembre 19 de 2014.

COMITÉ FIDUCIARIO: 11 de junio de 2015

- Rendición de cuentas periodo Octubre a Diciembre de 2014 y Enero a marzo de 2015.

La Dra. Londoño hace la presentación de las cifras de aportes, pagos, rendimientos y gastos correspondientes a la rendición de cuentas por el periodo Octubre Diciembre de 2014, a la cual los miembros del comité no hacen ninguna observación.

La Dra. Carmen Elisa continúa con la presentación de las cifras correspondientes al periodo Enero – Marzo de 2015, en ésta precisa que la Fiduciaria está haciendo el registro contable de los rendimientos por devolver a la Nación pero el traslado de los recursos no se ha realizado debido a que a la fecha dichos rendimientos deben continuar invertidos hasta tanto el Gobierno Nacional (Ministerio de Hacienda y Crédito y Crédito Público) expida el decreto reglamentario que establezca la periodicidad, metodología de liquidación y forma de traslado de dichos rendimientos, todo de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del Art. 10 de la Ley 1737 de 2014. El Dr. Andrés Ricardo Quevedo informa que hará las consultas pertinentes en el Ministerio para informar al comité la fecha estimada de dicha reglamentación.

- Informe Rendimientos acumulados a Marzo 31 de 2015 y saldo de carteras colectivas y cuenta de ahorro a junio 10 de 2015.

Se hace la presentación de cifras de los rendimientos por fuente de financiación acumulados a marzo 31 de 2015 y del saldo de las carteras colectivas y cuenta de ahorros a junio 10 de 2015, sin comentarios por los miembros del comité.

REUNIONES CON EL OPERADOR TINTO Y SETTA

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

- 16 de febrero de 2012: Se establece la mesa de trabajo para interactuar e ir consolidando el proceso de ejecución y operatividad de la implementación del SETP.
- 23 de febrero de 2012: Se explica diseño de los pedestales y M10 y a poner en consideración de la mesa de trabajo para unificar criterios, distribución de los pedestales para llevar a junta el inventario.
Intersección de la calle 21 con cra. 23, se hace la presentación de la propuesta para que la mesa de trabajo tenga conocimiento y de ahí indicarles cual fue la propuesta definitiva y las conveniente para la ciudad.
- 01 de marzo de 2012: Se hizo el recorrido de la calle 19 desde la carrera 29 hasta la carrera 21 observando secciones viales cuadra a cuadra.
- 22 de marzo de 2012: Presentación solución vehicular Universidad del Quindío.
- 19 de Abril de 2012: Gestión de Flota
- 30 de Agosto de 2012: Foro Transportadores, se realizo según lo acordado con la junta la reunión con los principales actores del transporte local y regional en sus distintas modalidades con el fin de exponer planteamientos del SETP y las problemáticas que se presentan debido a la integración del transporte y las condiciones actuales del mismo, a la cita asistieron Amable, por parte de la Nación el DNP y el Ministerio de Transporte, por parte del Municipio la secretaria de transito, Planeación Municipal e infraestructura y los representantes del gremio transportador de la ciudad y los municipios del Quindío, las veedurías y algunos otros asistentes de diferentes entidades.
- 15 abril de 2013: Se trataron temas relacionados con el proceso de implementación carril solo bus carrera 19 tramo sur desde la calle 30 hasta la proximidad de la glorieta 3 esquinas (calle 50) y las alternativas con carril solo bus sobre el proyecto vial de la calle 21 desde la carrera 19 hasta la carrera 29.
- 02 de mayo de 2013: Reunión con los transportadores, donde se trataron los temas de cambio de ruta de los buses intermunicipales provenientes del norte del Departamento, lineamientos de la empresa amable frente a los terminales de intercambio.
- 16 de mayo de 2013: Reunión con el Ing. Juan José Piedrahita Ríos consultor de los diseños de pavimento de la carrera 19 sur y de la calle 21. Visita técnica a la calle 21 y a la carrera 19 tramo sur
- 20 de mayo de 2013: Reunión con el Ing. Juan José Piedrahita Ríos consultor de los diseños de pavimento de la carrera 19 sur y de la calle 21. Visita técnica a la calle 21 y a la carrera 19 tramo sur
- 12 de junio de 2013: Concepto técnico del Ing. Juan José Piedrahita Ríos consultor de los diseños de pavimento de la carrera 19 sur y de la calle 21. Decisión técnica sobre la implementación o no del carril solo bus sobre la carrera 19 tramo sur desde la calle 30 hasta la proximidad de la glorieta 3 esquinas. Presentación alternativa definitiva con carril solo bus sobre el proyecto vial de la calle 21 para dar traslado a la firma consultora SEDIC S.A. para su aprobación.

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

- 22 de agosto de 2013: Se realizó en las horas de mañana, y se trataron temas relacionados con las propuestas de los terminales de intercambio y del sistema en general, dichas propuestas se deben revisar en Junta Directiva.

AUDITORIA CONTRALORÍA MUNICIPAL VIGENCIAS 2011, 2012, 2013 y 2014

- La Contraloría Municipal realizó la Auditoría Especial Financiera Vigencia 2011, encontrándose 4 hallazgos de tipo Administrativo, los cuales quedaron en firme. Como dichos hallazgos son de tipo administrativo, solo se requiere el Plan de Mejoramiento. A la fecha se encuentran debidamente cumplido el Plan de Mejoramiento planteado para corregirlos.
- El 24 de septiembre de 2012 se dio por terminado la Auditoría modalidad Regular a la Empresa Industrial y Comercial del Estado “AMABLE E.IC.E” vigencia 2011, quedando con 4 hallazgos en firme de tipo administrativo los cuales fueron ratificados el 23 de octubre; es de anotar que ya se han aplicado los correctivos necesarios y que se dio cumplimiento de manera inmediata a algunos de ellos ya que no representaban un proceso dispendioso.
- La Contraloría Municipal realizó la Auditoría Especial Financiera Vigencia 2012 que inicio en el mes de febrero de 2013 y culminó en el mes de abril de 2013, encontrándose siete (7) hallazgos de tipo Administrativo, los cuales se logro desvirtuar uno (1) de ellos quedando en firme seis (6). Como dichos hallazgos son de tipo administrativo, solo se requiere el Plan de Mejoramiento; a la fecha se encuentran cumplidos.
- Igualmente se recibió una Auditoría Especial al pago de Estampillas Pro-Universidad y Pro-desarrollo, donde nos arrojo un (1) hallazgo posiblemente de tipo fiscal por no encontrarse el pago de la Estampilla Pro-Universidad a la Adición al Contrato No. 002 de 2012, situación que fue subsanada en su momento, quedando en firme el hallazgo de tipo Administrativo; se realizó el plan de mejoramiento y acciones correctivas, y se dio cumplimiento.
- A partir del 2 de septiembre se inicio por parte de la Contraloría Municipal de Armenia la Auditoría de Gestión a la vigencia 2012.
- La Contraloría Municipal realizó la Auditoría Especial Vigencia 2013 que inicio en el mes de febrero de 2014 y culminó en el mes de octubre de 2014, encontrándose siete (7) hallazgos de tipo Administrativo, y uno (1) de tipo fiscal. Los hallazgos de tipo administrativo, solo se requiere el Plan de Mejoramiento; a la fecha se encuentran cumplidos; queda pendiente el hallazgo de tipo fiscal ya que es en conjunto con el municipio de Armenia (SETTA)

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

- La Contraloría Municipal realizó la Auditoría Especial Vigencia 2014 que inicio en el mes de febrero de 2015 y culminó en el mes de octubre de 2015, encontrándose siete (7) hallazgos de tipo Administrativo,. Los hallazgos de tipo administrativo, solo se requiere el Plan de Mejoramiento.
- La Contraloría Municipal realizó la Auditoría a la Contribución Especial del 5% aplicables a los contratos de obra pública de las Vigencia 2013 y 2014 encontrándose un (1) hallazgo administrativo con incidencia fiscal y traslado a la procuraduría. De este hallazgo se realizó el respectiva derecho de contradicción aduciendo que existen conceptos de entes tributarios donde se puede observar que se está realizando bien el proceso de descuento; nos encontramos a la espera de la respuesta al respecto por parte de la contraloría, donde se nos debe informar si queda en firme el hallazgo os es desvirtuado.

AUDITORIA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

- Entre el 8 y el 22 del mes de agosto se recibió la visita de tres (3) auditores de la Contraloría General de la República, cuyo motivo era el de realizar la revisión de la contratación de obra e interventoría realizada por el proyecto SETP desde su inicio (2009) a la fecha, con el fin de dar respuesta a una queja presentada ante esa entidad; al finalizar la Auditoría se realizo el cierre el día 22 de agosto de 2013 con la Gerente el equipo técnico, jurídico y la asesora de Control Interno, donde se realiza una entrevista relacionada con la contratación revisada, de la cual quedo un acta con las preguntas y respuestas dadas al respecto.

1. ÁREA FINANCIERA

Durante la estructuración y desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público en el año 2014; en el área financiera se destacan los siguientes puntos:


EJECUCIÓN RECURSOS DEL MUNICIPIO.

Los Aportes del Municipio con destino al Sistema Estratégico de Transporte Público de Armenia, se han recibido de acuerdo a lo dispuesto en el convenio de cofinanciación Nación - Municipio del 12 noviembre de 2009, y según aprobación de Junta Directiva mediante Acta No. 001 de mayo 05 /2010, dichos aportes se han ejecutado por intermedio de la empresa AMABLE E.I.C:E.

EJECUCIÓN RECURSOS DEL MUNICIPIO

Los Aportes de la Nación con destino al Sistema Estratégico de Transporte Público de Armenia, se han recibido en forma parcial teniendo en cuenta que se le han realizado dos (02) otrosí al convenio de cofinanciación Nación - Municipio del 12 noviembre de 2009, y según aprobación de Junta Directiva mediante Acta No.

001 de mayo 05 /2010, dichos aportes se han ejecutado por intermedio de la empresa AMABLE E.I.C:E.



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

CONTRATACIÓN

Durante la vigencia 2012 se realizó contratación por diferentes modalidades, de acuerdo con las necesidades a cumplir dentro del desarrollo del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público SETP; a continuación se detalla la relación de la contratación, al igual que los procesos para adjudicaciones:

CONTRATACIÓN 2012		
DETALLE	No. Ctos.	VALOR
Prestación de servicios Profesionales	57	\$ 803.579.826.00
Prestación de Servicios Apoyo a la gestión	8	\$ 51.520.000.00
Suministro	5	\$ 44.670.683.00
Compraventa	4	\$ 30.117.961.00
Publicidad	55	\$92.700.000.00
Obra	6	\$5.746.856.803.00
Consultoría	6	\$ 415.836.704.24
Transporte	1	\$ 17.160.000.00
TOTAL		\$ 7.202.441.680.24

Durante la vigencia 2013 se realizó contratación por diferentes modalidades, de acuerdo con las necesidades a cumplir dentro del desarrollo del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público SETP; a continuación se detalla la relación de la contratación, al igual que los procesos para adjudicaciones:

CONTRATACIÓN		
DETALLE	No. Ctos.	VALOR
Prestación de servicios Profesionales	52	\$ 740.071.001.00
Prestación de Servicios Apoyo a la gestión	7	\$ 40.002.666.00
Suministro	2	\$35.530.576.00
Publicidad	24	\$92.453.376.00
Obra	4	\$12.801.348.531,75
Consultoría	4	\$ 805.351.494.00
Compraventa	1	800.000.00
TOTAL		\$14.515.557.644.75

CONTRATACIÓN 2014

Durante la vigencia 2014 se realizó contratación por diferentes modalidades, de acuerdo con las necesidades a cumplir dentro del desarrollo del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público SETP; a continuación se detalla la relación de la contratación, al igual que los procesos para adjudicaciones:

ENERO – MARZO

TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS.	VR. CONTRATOS.
CONSULTORIA	5	\$1.444.358.190.00
OBRA	4	\$22.097.211.128.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	28	\$587.168.134.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	5	\$51.158,334.00
SUMINISTRO	3	\$ 23.641.000.00
COMPRAVENTA	0	\$ 0.00
PUBLICIDAD	3	\$0.00
TOTAL CONTRATACION	7	\$ 24.203.536.786,00

ABRIL - JUNIO 2014

TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS.	VR. CONTRATOS.
CONSULTORIA	0	\$0.00
OBRA	0	\$0.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	0	\$0.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	0	\$0.00
SUMINISTRO	1	\$ 9.336.000.00
COMPRAVENTA	0	\$ 0.00
PUBLICIDAD	17	\$84.670.684.00
TOTAL CONTRATACION	18	\$94.006.684,00

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

JULIO A SEPTIEMBRE 2014

TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS.	VR. CONTRATOS.
CONSULTORIA	0	\$0.00
OBRA	0	\$0.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	31	\$455.325.868.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	4	\$ 30.600.000.00
SUMINISTRO	0	\$0.00
COMPRAVENTA	1	\$ 15.000.000.00
PUBLICIDAD	18	\$ 96.519.280.00
TOTAL CONTRATACION	18	\$597.445.148,00

OCTUBRE - DICIEMBRE 2014

TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS.	VR. CONTRATOS.
CONSULTORIA	1	\$ 249.284.000.00
OBRA	0	\$0.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	3	\$ 11.853.334.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	15	\$ 18.000.000.00
SUMINISTRO	0	\$0.00
COMPRAVENTA	4	\$ 32.487.394.00
PUBLICIDAD	12	\$ 23.360.000.00
TOTAL CONTRATACION	35	\$334.984.728,00

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

CONTRATACIÓN 2015

Durante la vigencia 2015 se realizó contratación por diferentes modalidades, de acuerdo con las necesidades a cumplir dentro del desarrollo del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público SETP; a continuación se detalla la relación de la contratación, al igual que los procesos para adjudicaciones:

ENERO A MARZO 2015

TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS.	VR. CONTRATOS.
CONSULTORIA	3	\$1.453.743.790.00
OBRA	1	\$6.502.094.240.70
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	32	\$ 287.281.850.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	4	\$ 18.900.000.00
SUMINISTRO	2	\$ 18.729.000.00
COMPRAVENTA	1	\$ 10.454.471.00
CORRESPONDENCIA	1	\$ 1.485.000.00
AVALUOS	1	\$ 5.167.800.00
TOTAL CONTRATACION	45	\$ 8.297.856.151.70

ABRIL A JUNIO 2015

TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS.	VR. CONTRATOS.
CONSULTORIA	1	\$ 225.011.000.00
OBRA		\$0.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	30	\$ 671.418.533.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (ADICIÓN)	31	\$ 140.097.000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	4	\$ 46.780.000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN (ADICIÓN)	4	\$ 9.450.000.00
SUMINISTRO	0	\$ 0.00
COMPRAVENTA	0	\$ 0.00
CORRESPONDENCIA	0	\$ 0.00
AVALUOS	0	\$ 0.00
TOTAL CONTRATACION	70	\$ 1.092.756.533.00

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

JULIO - SEPTIEMBRE 2015

TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS.	VR. CONTRATOS.
CONSULTORIA	1	\$ 125.530.850.00
OBRA	1	\$1.260.045.449.95
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	30	\$ 321.657.200.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	7	\$ 35.770.000.00
TOTAL CONTRATACION	70	\$ 1.743.003.499.95

OCTUBRE - DICIEMBRE 2015

TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS.	VR. CONTRATOS.
CONSULTORÍA	1	\$ 638.685.200.00
OBRA	1	\$9.941.265.676.11
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	4	\$ 19.333.333.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	1	\$ 2.900.000.00
TOTAL CONTRATACIÓN	7	\$ 10.602.184.209.11

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

EJECUCION DE OBRAS VIGENCIA 2012

INFORME DE GESTIÓN 2012

1. PROYECTOS CONSTRUIDOS

1.1. AVENIDA PRIMERO DE MAYO



OBJETO: REHABILITACION VIAL DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SETP – ARMENIA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: **\$2.250.023.898.00**

Valor contrato: \$2.083.282.927.00.

Valor interventoría: \$ 143.949.040.00

Adición Interventoría: \$ 22.791.931.00

Valor total Interventoría: **\$ 166.740.971.00**

Contratista: CONSORCIO PRANHA - AMABLE – 003,
Representante Legal: Ing. JAIME ALBERTO OSORIO GIL.
Interventor: WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ.
Meta física: 7334 m2
Estado: Construido 100%

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

1.2. URBANIZACIÓN VILLA HERMOSA



OBJETO: REHABILITACIÓN VIAL DE LA URBANIZACIÓN VILLA HERMOSA, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SETP – ARMENIA

Valor contrato: \$443.587.059.00
Valor Ejecutado: \$439.876.203.00
Contratista: CONSORCIO CONSTRUCCIONES CIVILES 3,
Representante Legal Ing. JUAN CARLOS SÁNCHEZ GÁLVEZ.
Interventor: CONSORCIO BC.
Meta física: 2424 M2.
Estado: Construido 100%

Nota: La interventoría ejecuta por el CONSORCIO BC. Fue una sola para la rehabilitación vial de la urbanización Villa Hermosa y Manantiales, por un valor de: \$90.672.994.00

1.3. URBANIZACIÓN MANANTIALES

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



OBJETO: REHABILITACIÓN VIAL DE LA URBANIZACIÓN MANANTIALES, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SETP – ARMENIA

Valor contrato: \$ 740.206.075.00
Valor ejecutado: \$ 740.010.687,12
Contratista: CONSORCIO JSC,
Representante Legal Ing. ADRIANA CADENA MUÑOZ.
Interventor: CONSORCIO BC.
Meta física: 5642 M2
Estado: Construido 100%

Nota: La interventoría ejecuta por el CONSORCIO BC. Fue una sola para la rehabilitación vial de la urbanización Villa Hermosa y Manantiales, por un valor de: \$90.672.994.00

1.4. PARADERO CON ESPACIO PUBLICO MIRADOR DE LA SECRETA

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARADERO CON ESPACIO PUBLICO MIRADOR DE LA SECRETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE - SETP - CIUDADES AMABLES.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: **\$1.110.749.702.00**

VALOR TOTAL EJECUTADO PROYECTO: **\$1.050.732.673.00**

Valor Obra: \$1.027.749.702.00

Valor Ejecutado: \$ 967.732.673.00

Valor Interventoría: \$ 83.000.000.00

Contratista de obra: B&V INGENIERÍA S.A.S

Representante Legal: JORGE ALBERTO BOADA S.

Interventor: SANDRA LILIANA MOLANO

Meta física: 2688 M2

Estado: Construido 100%

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

1.5. PARADERO CON ESPACIO PUBLICO COLISEO DEL CAFÉ



OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARADERO CON ESPACIO PUBLICO COLISEO DEL CAFÉ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE - SETP - CIUDADES AMABLES

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	\$767.942.280.00
VALOR TOTAL EJECUTADO PROYECTO:	\$767.345.290.00
Valor Obra:	\$679.448.313,00
ADICIONAL 001	<u>\$ 22.000.748,00</u>
Total Obra	\$700.852.071.00

Valor Interventoría:	\$66.493.219,00
Contratista obra:	CONSORCIO EL DANUBIO
Representante Legal:	JUAN SEBASTIÁN MORALES C.
Interventor:	SANDRA LILIANA MOLANO
Meta física:	1451 M2
Estado:	Construido 100%

1.6. RENOVACIÓN DE ANDENES CARRERA 17 Y CALLE 16 SECTOR CENTRO– TRAMO PILOTO

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



 TRAMO I - PILOTO

OBJETO: RENOVACIÓN ANDENES SECTOR CENTRO-TRAMOS CARRERA 17 ENTRE CALLES 17 Y 21 Y CALLE 16 ENTRE CARRERAS 14 Y 16-DENTRO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP - CIUDADES AMABLES

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: **\$ 792.549.526.00**
 VALOR TOTAL EJECUTADO PROYECTO: **\$ 753.168.360.00**

Valor contrato Obra: \$ 734.054.206.00
 Valor Ejecutado Contrato: \$ 687.704.436.00

Valor interventoría: \$58.495.320.00
 Adición Contrato \$ 6.968.604.00
 Total Interventoría \$65.463.924.00

Contratista de obra: CONSORCIO MS-2050
 Representante Legal: ING JAIME ALBERTO RUIZ
 Interventor: CONSORCIO CABA ING S.A.S
 Representante Legal: CARLOS ALBERTO BALLESTEROS
 Meta física: 2940 M2
 Estado: Construido 100%

2. PROYECTOS EN PROCESO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

La planificación de los proyectos que se deben ejecutar según el plan de adquisiciones y el POA, tiende a una serie de procesos que se realiza por el equipo técnico de Amable, donde se contempla la revisión de presupuestos, elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones para envío al Ministerio

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
 twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

de Transporte donde son revisados y aprobados para el inicio de la etapa licitatorio.

2.1. TERMINAL DE RUTA AEROPUERTO



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

EJECUCIÓN DE OBRAS VIGENCIA 2013

INFORME DE GESTIÓN 2013

3. PROYECTOS CONSTRUIDOS

- REHABILITACION VIAL DE LA CALLE 10 NORTE



OBJETO: REHABILITACIÓN VIAL DE LA CALLE 10 NORTE, ENTRE LA CARRERA 14 Y LA CARRERA 19, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP - ARMENIA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: **\$ 1.564.137.094.00**

Valor contrato Obra: \$ 1.466.085.020.00

Valor interventoría: \$98.052.074.00

Contratista de obra: CONSORCIO PRAHNA AMABLE 003
Representante Legal: Ing. JAIME ALBERTO OSORIO GIL.
Interventor: WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ
Representante Legal: WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03


24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Estado: Ejecutado

Total personal en obra: 48 personas.
% Personal de la Región: 97%

- REHABILITACIÓN VIAL CARRERA 19 TRAMO SUR

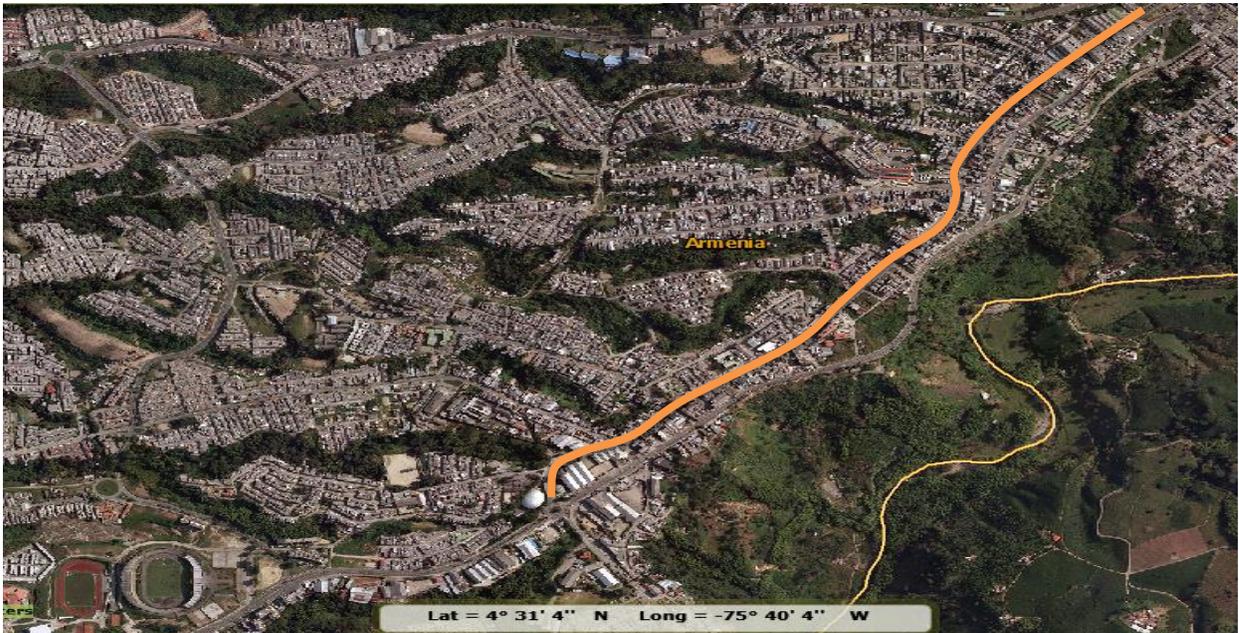

OBJETO: REHABILITACIÓN VIAL DE LA CARRERA 19 TRAMO SUR, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP - ARMENIA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: **\$ 3.538.524.420.00**

Valor contrato Obra: \$ 3.337.030.260.00

Valor interventoría: \$ 201.464.160.00

Contratista de obra: CONSORCIO CIUDAD MILAGRO 003
Representante Legal: Ing. SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
Interventor: CONSORCIO INTERVÍAS AMABLE
Representante Legal: Ing. JOHN FABER CARMONA MEJÍA
Estado: Ejecutado

Construido 100%

Total personal en obra: 37 personas.
% Personal de la Región: 100%

- REHABILITACIÓN VIAL Y RENOVACIÓN DE ANDENES EN DIFERENTES SECTORES DEL CENTRO DE ARMENIA.



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

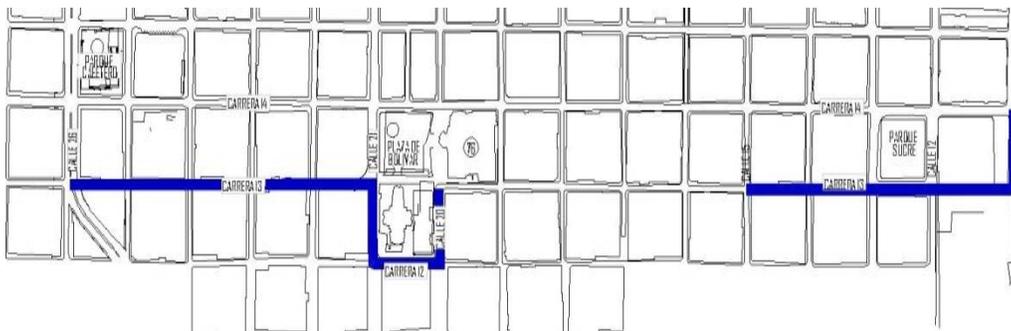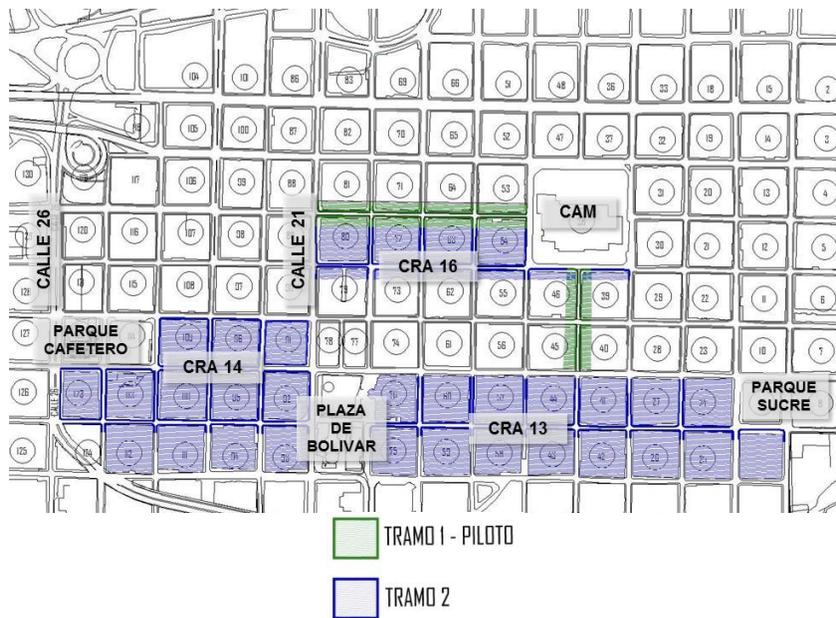

OBJETO: REHABILITACIÓN VIAL Y RENOVACIÓN DE ANDENES EN DIFERENTES SECTORES DEL CENTRO DE ARMENIA, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: **\$ 5.042.834.780.75**

Valor contrato Obra: \$ 4.722.534.560,75

Valor interventoría: \$ 320.300.220.00

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Contratista de obra: CONSORCIO RENOVACIÓN URBANA
 Representante Legal: ing. JAIME PUERTA ATEHORTUA
 Interventor: CONSORCIO CABA INGENIERIA SAS-WHLV
 Representante Legal: Ing. Carlos Alberto Ballesteros Aristizabal
 Estado: Ejecutado

OBJETO: REHABILITACIÓN VIAL CALLE 50 ENTRE LA CARRERA 19 Y LA GLORIETA LOS NARANJOS, INCLUYE RENOVACIÓN DE ANDENES EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP - ARMENIA”


VALOR TOTAL DEL PROYECTO: \$ 3.461.233.731.00

Valor contrato Obra: \$ 3.275.698.691.00

Valor interventoría: \$ 185.535.040.00

Contratista de obra: CONSORCIO ARMENIA URBANO
 Representante Legal: ing. Guillermo León Acero Castellanos
 Interventor: CONSORCIO CABA INGENIERIA CARMONA CARVAJAL SAS

Representante Legal: Ing. Carlos Alberto Ballesteros Aristizabal
 PLAZO DE EJECUCION: Seis (6) meses
 FECHA DE ADJUDICACION: 17 de septiembre de 2013
 FIRMA DE CONTRATO: 25 de Septiembre de 2013
 Estado: Ejecutado

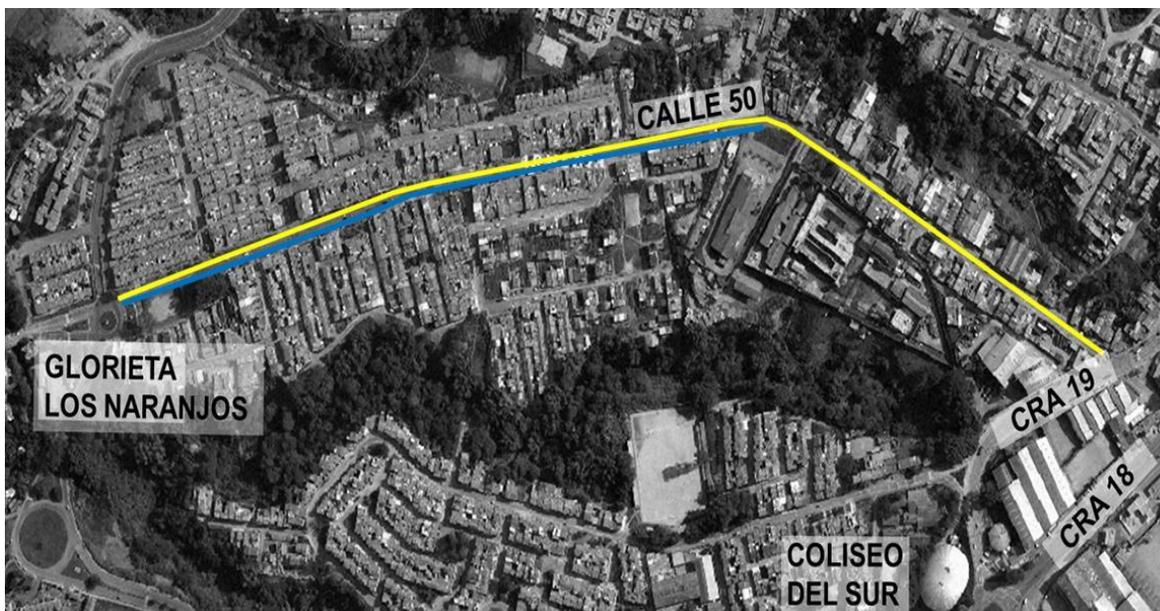

- TRAMO 1 (A - B)
REHABILITACION VIAL
- TRAMO 1 (B)
RENOVACION DE ANDENES

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL CALLE 50 ENTRE LA CARRERA 19 Y LA GLORIETA LOS NARANJOS, INCLUYE RENOVACIÓN DE ANDENES EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
 twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP - ARMENIA”

PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE ADJUDICACIÓN:

Siete (7) meses
16 de septiembre de 2013



OBRAS EN EJECUCIÓN	INVERSION TOTAL EN EJECUCIÓN
REHABILITACION VIAL DE LA CARRERA 19 TRAMO SUR	\$3.538.494.420
REHABILITACION VIAL CALLE 10 NORTE	\$1.564.137.094
REHABILITACION VIAL Y RENOVACION DE ANDENES EN DIFERENTES SECTORES DEL CENTRO DE ARMENIA TRAMO II	\$5.042.834.782
REHABILITACION VIAL Y RENOVACION DE ANDENES CALLE 50	\$3.461.233.731
TOTAL	\$13.606.700.027

INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN - AVANCE DE PROYECTOS

PROYECTO VIAL CALLE 21


Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

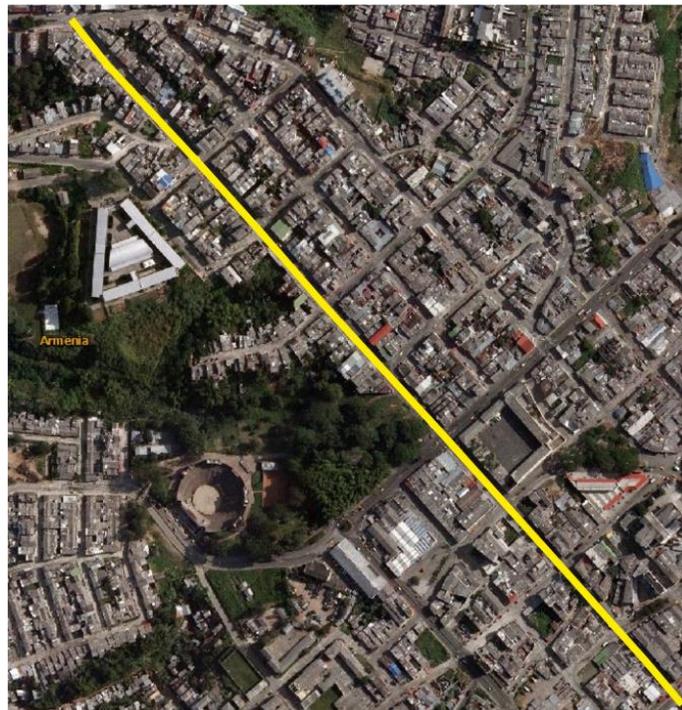

El municipio de Armenia, a través de la Secretaría de infraestructura municipal, en atención a sus competencias y en ejecución de sus obligaciones contenidas en el convenio de cofinanciación para la implementación del proyecto SETP, seleccionó como contratista por medio de un concurso de méritos a **SEDIC S.A**, empresa idónea y con experiencia acreditada de acuerdo a los requisitos exigidos por la ley y la entidad durante el proceso público de selección contenido en el numeral 3 del artículo 2º de la ley 1150 de 2007, para realizar los estudios y diseños requeridos para la carrera 23 con calle 21, en atención del documento CONPES 3572 de 2009, y con ello determinar la conveniencia de ejecutar la depresión vial que inicialmente había sido considerada por la Nación desde el documento CONPES, en desarrollo del proyecto SETP para la ciudad de Armenia; El contratista en cumplimiento de su labor, suministró los estudios y diseños contratados y se pronunció técnicamente al respecto, lo que produjo una serie de mesas de trabajo con el municipio, el ente gestor del proyecto SETP "AMABLE E.I.C.E." y las empresas de servicios públicos domiciliarios.

Con fundamento en los estudios del consultor experto contratado y las conclusiones de las mesas de trabajo interinstitucionales, se estableció al aplicar la matriz de Saaty (*Método de jerarquización analítica*), que era conveniente técnica y presupuestalmente el ejecutar otras alternativas a la depresión vehicular en la intersección de la carrera 23 con calle 21 de Armenia, y que realmente contribuirán a la ciudad, en lugar de construir la depresión vial proyectada en la planificación del proyecto SETP para la ciudad de Armenia.

En Noviembre de 2010, la empresa consultora SEDIC S.A. presentó el informe correspondiente a la determinación de tránsito futuro y estudio de alternativas de solución al conflicto de movilidad de la intersección mencionada. En primera instancia, la empresa SEDIC S.A. de las cuatro alternativas presentadas en su informe, recomendó como la mejor opción la alternativa 4, la cual considera la calle 21 deprimida dejando al nivel actual las carreras 22 y 23; en esta última carrera se implementaría una glorieta donde se posibilitaría realizar todas las maniobras de giro; Posteriormente a la alternativa recomendada por SEDIC S.A. se planteó la ampliación a dos carriles por sentido sobre la calle 21, con el propósito de mejorar capacidad y niveles de servicio, al ser este corredor el que arroja mayor flujo vehicular en el estudio de volúmenes vehiculares realizados a

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

dicha intersección. Esta alternativa con esta ampliación se convirtió en una 5ª alternativa.

Una vez se tuvieron disponibles dichos estudios, se efectuaron varias reuniones por parte del grupo interdisciplinario conformado por La secretaria de infraestructura, La secretaria de planeación, La Secretaria de Tránsito y Transporte (SETTA) del municipio de Armenia; Las empresas públicas de Armenia (EPA), La consultora encargada del estudio SEDIC S.A., La interventoría del proyecto de consultoría Millán y Martínez Asociados LTDA y el personal de la empresa AMABLE E.I.C.E, donde se analizaron cada una de las alternativas entregadas, identificando particularmente:

- Del estudio geotécnico se obtuvo que el suelo presente en este sitio (carrera 23 con calle 21) es de tipo volcánico, por ende si se realizara la solución con deprimido, el costo de los muros laterales del deprimido, sería exageradamente alto, al requerirse la utilización de pilas profundas de 1.50 metros de diámetro y espaciadas cada 2.50 metros.
- La alternativa 5 en deprimido recomendada por SEDIC S.A. es una solución de tipo puntual sobre la intersección de la carrera 23 con calle 21; si se implementará esta alternativa, lo que se haría es trasladar el problema a las calles aledañas donde inicia y finaliza el deprimido convirtiéndolas en cuellos de botella, al no poderse conservar la misma sección requerida sobre todo el corredor de la calle 21.
- Las soluciones planteadas en deprimido generan un grave impacto ambiental sobre el parque el Bosque, el cual no puede ser intervenido al estar apreciado como red de parques de la vida dentro de la estructura ecológica principal (Artículo 84 POT).
- Al plantear una solución en deprimido debe considerarse el acondicionamiento de la red de alcantarillado de toda la calle 21, ya que la calle 21 con carrera 23 es un punto importante de distribución de la red de servicios públicos, al tratarse de la ubicación más alta de la ciudad.

Por lo expuesto anteriormente el grupo interdisciplinario ya mencionado, considero la necesidad de plantear alternativas adicionales diferentes a las basadas en la construcción de un deprimido bajo la carrera 23 con calle 21, considerando las consecuencias adversas de tipo ambiental, técnico y financiero.

Para ello, el equipo técnico de Amable E.I.C.E. planteo cuatro (4) alternativas, tres (3) a nivel y un puente elevado, donde se consideró una solución global sobre la movilidad de la malla vial aledaña a la intersección, buscando no trasladar el problema de movilidad del sector a otro punto y evitar la incidencia ya mencionada.

Una vez se tuvieron las nueve (9) alternativas, cinco (5) por SEDIC S.A. y cuatro (4) por amable E.I.C.E., el grupo interdisciplinario (*conformado por La secretaria de infraestructura, La secretaria de planeación, La Secretaria de Tránsito y Transporte (SETTA), Las empresas públicas de Armenia (EPA), La consultoría del estudio SEDIC S.A., La interventoría del proyecto Millán y Martínez Asociados LTDA y AMABLE E.I.C.E.*) optó para la calificación de las 9 alternativas de solución propuestas, por la aplicación del **Método de Jerarquización Analítica** desarrollado durante los años setentas en la Universidad de Pennsylvania por el Dr. Thomas L. Saaty, el cual considera que para la solución de un problema, el decisor transita por tres etapas: *inicia con la formulación del problema, luego realiza una evaluación y finalmente selecciona el mejor curso de acción que más contribuya al logro del objetivo.*

Este método de jerarquización analítica se escogió porque su metodología aplica al proceso y por tener como precedente en su aplicación dos proyectos de vital importancia en la ciudad de Armenia como lo son el complejo vial La Cejita y la intersección a desnivel sobre la carrera 14 (Avenida Bolívar) con Calle 2.

Esta calificación desarrollada en conjunto por el grupo interdisciplinario ya mencionado, tuvo como objetivo escoger la mejor solución acorde a las necesidades tanto del tránsito vehicular, así como la de los peatones y residentes del sector.

Los parámetros de calificación considerados en la matriz de Saaty se presentan a continuación:

- Manejo urbanístico
- Diseño geométrico y manejo del tránsito
- Manejo de movimientos en la intersección.
- Vida útil.
- Manejo del flujo peatonal.
- Grado de dificultad en la construcción
- Afectación predial
- Reubicación de redes de servicio
- Costo global de la obra
- Desarrollo por etapas
- Aprovechamiento de la infraestructura existente.
- Plan de contingencia
- Impacto al comercio e instituciones.
- Impacto ambiental: *Para el análisis de cada una de las alternativas se tuvo como principal factor de consideración, el impacto ambiental generado sobre el parque el Bosque, el cual está apreciado como integrante de la red de parques de la vida dentro de la estructura ecológica principal (Artículo 84 POT) y por tanto no se permite intervenirlo.*

La Alternativa que obtuvo la mejor calificación una vez aplicada la metodología de Saaty, con los criterios anteriores de evaluación, fue la número 6, que plantea el manejo del flujo vehicular mediante pares viales a nivel. Esta alternativa, deja la calle 21 con 3 carriles en una sola dirección (Este – Oeste) desde la carrera 19 hasta la intersección con la avenida las Américas; y las calles 19 y 20 en el sentido oeste – este, desde la carrera 19 hasta la intersección con la avenida las Américas, formando un par vial que distribuya mejor el flujo vehicular sobre los 3 corredores, y así no se exceda la capacidad de la calle 21.

Es de recalcar que además de mejorar el conflicto vehicular dejando la calle 21 en un solo sentido de circulación, se plantea disminuir los tiempos de viaje en transporte público al tener flujos vehiculares continuos con los pares viales, por otro lado se brinda la posibilidad de darle más utilidad a la Avenida Cisneros, descargando las vías céntricas de los vehículos que se dirigen al sur y sur – occidente de la ciudad.



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013


Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Condición Actual



Alternativa seleccionada

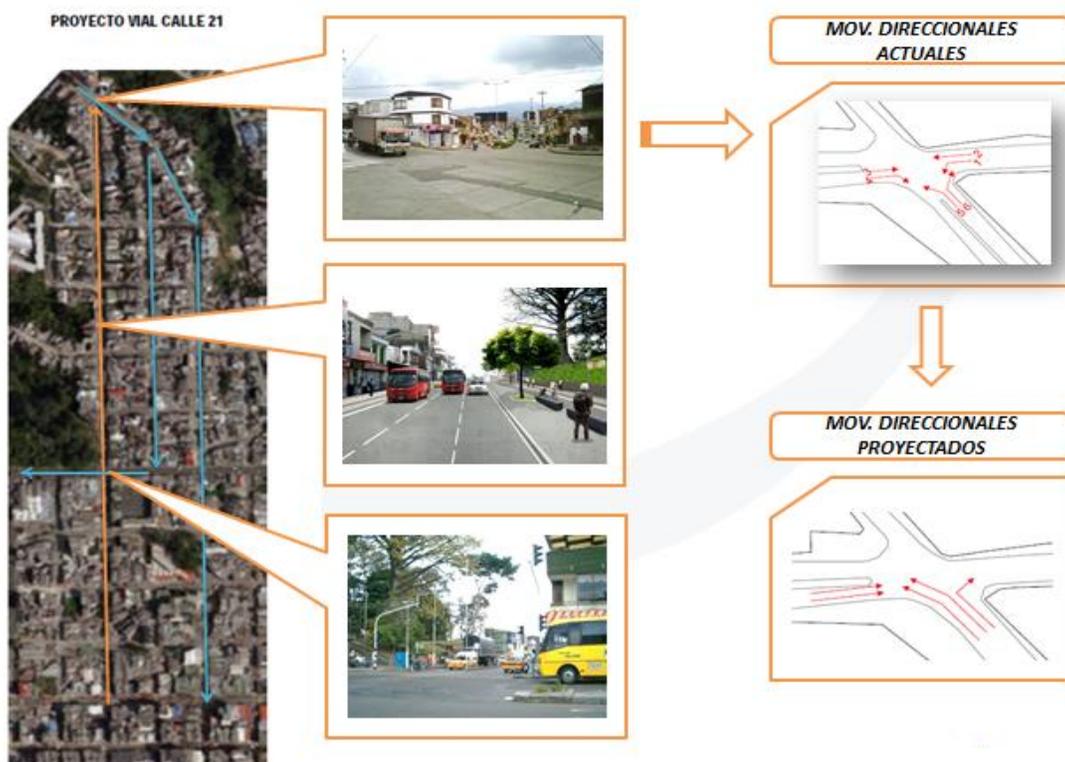

Con Semáforos

El equipo técnico de Amable E.I.C.E. con la sugerencia de la secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia SETTA

Con el propósito de no trasladar hacia la calle 19 las rutas del servicio de transporte público que transitan y transitarán con el SETP, en el sentido occidente - oriente sobre la calle 21, El equipo técnico de Amable E.I.C.E. por petición de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia SETTA, planteo sin cambiar el principio de la alternativa seleccionada (pares viales), un carril solo bus sobre la calle 21 en el sentido occidente - oriente desde la carrera 29 hasta la carrera 19, como se presenta en la siguiente

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03


24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

ilustración.

Carriles	3.25m
Carril solo bus	3.50m
Anden Margen Derecha	2.90m aprox.
Anden Margen Izquierda	3.90m aprox.

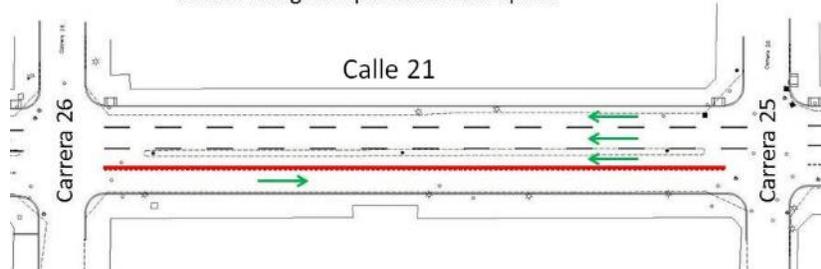

Siguiendo el conducto regular para este último planteamiento el equipo técnico de Amable, envió los diseños para su revisión y aprobación a la firma SEDIC S.A. de la ciudad de Medellín, empresa responsable del contrato de consultoría 009 de 2010 (Ejecutado por Infraestructura). La empresa SEDIC S.A. manifestó mediante oficio a AMABLE E.I.C.E. que ellos ya cumplieron el objeto de su contrato al entregar los productos técnicos a la Secretaría de infraestructura municipal de Armenia, y cualquier cambio o alternativa adicional al proyecto, obedece a realizar nuevos estudios; por lo tanto no pueden dar un aval a modificaciones que se realicen a los diseños ya entregados.

Amable E.I.C.E. como ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte y cada uno de las entidades participantes en este proceso, han tenido como objetivo buscar una solución integral al conflicto de movilidad de la intersección y de la malla vial que allí confluye, mejorando las características viales de los corredores para mejorar la movilidad del transporte público y del flujo vehicular, así como generar la ampliación de andenes como corredores necesarios e indispensables para el desplazamiento seguro del peatón como usuario del sistema de transporte público en el proceso de intercambio de modos de transporte, a la vez que aplica los principio de conservación del medio ambiente y las áreas de protección existentes, como el parque El Bosque de la ciudad de Armenia.

Los estudios y diseños entregados por la firma consultora SEDIC S.A. correspondientes a los soportes de la ejecución del contrato de consultoría 009 de 2010, reposan en el archivo de la Secretaría de Infraestructura Municipal, teniendo en cuenta que el municipio de Armenia en cumplimiento del convenio de cofinanciación suscrito con la nación en noviembre de 2009, se comprometió a ejecutar los recursos del proyecto hasta que el ente gestor del proyecto SETP "AMABLE E.I.C.E." constituyera el encargo fiduciario para el proyecto, situación acaecida en octubre de 2010.

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013


Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Respecto al presupuesto definitivo para el Proyecto vial de la calle 21, se está elaborando con la modulación (Diseño) de los andenes y los diseños de pavimentos elaborados por el consultor Ing. Juan José Piedrahita R. El proceso de socialización se tiene programado para el segundo semestre de 2013 y la ejecución del proyecto para el año 2014, se surtirá cumpliendo con las etapas contractuales de ley, respecto de la publicación, Calificación, adjudicación y ejecución del contrato.



4. RED SEMAFORICA Y CENTRO DE CONTROL

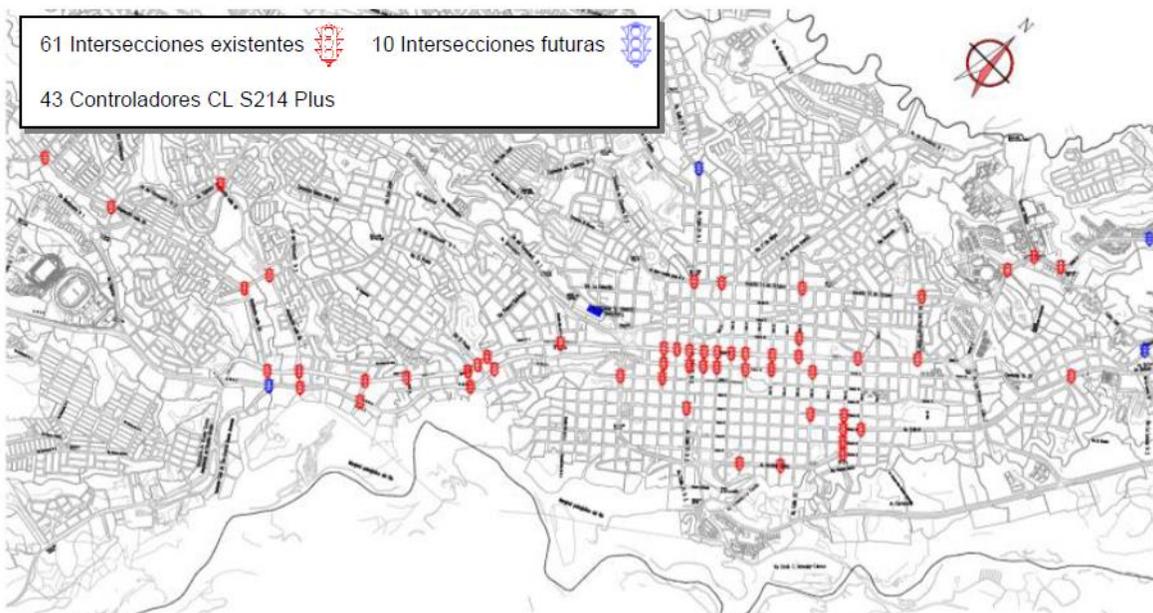

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE CONTROL Y RED SEMAFÓRICA DE ARMENIA.

La gerente de Amable E.I.C.E. con el acompañamiento del equipo técnico de la empresa, realizó visitas técnicas al centro de control y gestión de tráfico en las ciudades de Santiago de Cali, Pereira, Medellín y asistió al evento de AndinaTraffic en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de recopilar la información necesaria que den apoyo para la elaboración de los documentos técnicos donde se especifiquen los requerimientos del sistema en cuanto a la red semafórica y Centro de control para la ciudad de Armenia.

De igual forma se han adelantado reuniones técnicas con empresas nacionales e internacionales, en el proceso de recopilar la información necesaria que den apoyo para la elaboración de los documentos técnicos donde se especifiquen los requerimientos del sistema en cuanto a la red semafórica y Centro de control para la ciudad de Armenia.

Se elaboró por parte del equipo técnico de Amable E.I.C.E. y SETTA los informes técnicos y los respectivos estudios previos donde se consignaron los requerimientos tecnológicos, para el diseño de la red semafórica y centro de control para la ciudad de armenia, según requerimientos de la Nación, visitas técnicas a empresas afines con el tema, y con la información de estudios técnicos, cotizaciones e inventarios realizados por el equipo técnico de Amable E.I.C.E. y la Secretaria de transito y transporte de Armenia SETTA.

4.1. PROGRAMACION CONTROL Y GESTION DE FLOTA



La gerente de Amable E.I.C.E. con el acompañamiento del equipo técnico de la empresa, realizo visita técnica al Centro de recaudo, centro de control y operación de Megabus en la ciudad de Pereira, al centro de control de la secretaria de movilidad de Medellín; y al centro de control de operación de Transmilenio donde se recopiló la información y análisis de los siguientes temas en el proceso de implementación del SETP para la ciudad de Armenia.

Temas Analizados

- Planeación del servicio de transporte público de acuerdo con las necesidades y deseos de viaje de los usuarios, optimización de recursos del sistema y reducción del impacto de su costo sobre la tarifa al usuario.
- Análisis al registro al sistema de acuerdo al recorrido de las rutas y como se garantiza lo programado.
- Control y regulación de la operación de la flota, de manera que se minimicen las desviaciones entre la ejecución de los servicios y la programación establecida previamente.
- Suministro de información a los usuarios del sistema en relación con los aspectos más relevantes del plan de rutas, como por ejemplo, información sobre itinerarios, incidencias, entre otros.

- Procesamiento de la información histórica de la operación, de manera que permita optimizar los recursos del sistema mediante la retroalimentación del proceso de planeación o programación operativa.
- Análisis de la plataforma tecnológica.
- Información pre operacional requerida antes de implementarse el sistema.
- Proceso de licitación
- Proceso de implementación
- Los agentes involucrados para el desarrollo del sistema.
- Esquema de operación donde se identifiquen los derechos y obligaciones de cada uno de los agentes involucrados en el sistema.
- Estructura funcional del sistema.
- Problemas que se puedan presentar.

Adicionalmente a las visitas técnicas, Amable analizo los requerimientos de actualización de estudios Preoperacionales que se hacen necesarios para la estructuración del SETP antes de entrar en operación y para ello solicito ante el Departamento Nacional de Planeación DNP y ante el Ministerio de Transporte, dichos requerimientos (*actualización de la matriz origen – destino, actualización del estudio de Ascensos y descensos, reestructuración del sistema operacional de rutas, metodología del transbordo, puntos de transbordo, manejo del Transbordo con los intermunicipales ya que no se encuentra reglamentado por el ministerio, estructuración tarifaria con transbordo y el Recaudo y sostenibilidad del sistema*).

Ante dicha solicitud el Departamento Nacional de Planeación contrato con la empresa consultora GSD+Centro Nacional de Consultoría un estudio que tuvo por objeto el “Levantamiento de una línea de base que permita describir técnicamente la situación actual en materia de movilidad de la ciudad de armenia, así como los principales aspectos urbanísticos relacionados con la prestación del servicio de transporte público colectivo, y la caracterización de los usuarios y no usuarios de dicho servicio con el fin de contar con información precisa y actualizada, previa la entrada en funcionamiento del sistema estratégico de transporte público SETP de la ciudad, que sea útil para su posterior evaluación”.

Una vez entregados los estudios mencionados en el párrafo anterior, el equipo técnico de Amable y SETTA realizó una revisión y evaluación a dichos documentos, y se hicieron las respectivas observaciones técnicas que fueron enviadas formalmente al ingeniero Julián Daniel Muñoz C. de la dirección de políticas Publicas del DNP; mediante oficio AM-PGG-SETP-508 del 14 de Agosto de 2013.

Con el documento final entregado por el DNP (Línea base para la ciudad de Armenia) se estableció con que estudios PreOperacionales se cuenta y cuales harían falta en el proceso de estructuración del componente operacional del SETP. Los estudios por ejecutar se realizaran mediante consultoría (Concurso de méritos).

Una vez conocidos los productos de Línea base e identificado los estudios pre operacionales de prioridad, El equipo técnico de Amable realizo un ajuste al cronograma de actividades a realizar en el componente operacional, y se inició con el proceso de elaboración de estudios previos para la contratación de la matriz origen – destino y estudios complementarios según requerimientos operacionales del SETP.

EJECUCIÓN DE OBRAS VIGENCIA 2014

5. PROYECTOS CONSTRUIDOS

Avance de Proyectos adjudicados 2013, ejecutados 2014

Calle 16 y Carrera 13 - Rehabilitación vial + Andenes

Avance de Proyectos adjudicados 2013, ejecutados 2014

Calle 16 y Carrera 13 - Rehabilitación vial + Andenes

<u>Total Obra + Interventoría</u>	<u>\$ \$5.042.834.780</u>
<u>Rehabilitación vial</u>	<u>\$ 1,131,621,645</u>
<u>Renovación de Andenes</u>	<u>\$ 3,590,912,915</u>
<u>Interventoría</u>	<u>\$ 320,300,220</u>

Construcción: Consorcio Renovación Urbana

Interventoría: Consorcio Caba Ingeniería SAS – WHLV

Meta Física:

Vía: 5,664 m2 en 790 ml

Total Personas en Obra: 190

Andenes: 13,400 m2

% del personal de la región: 85%



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Proyectos adjudicados 2013, ejecutados 2014

Calle 50 – Rehabilitación vial + Andenes

ENTRE CARRERA 19 Y GLORIETA LOS NARANJOS:

*Se realiza una prorroga de 1 mes en calle 50 con el fin de articular el trabajo del centro comunitario y la construcción de sus andenes.

Construcción: Consorcio Armenia Urbano

Interventoría: Consorcio Caba Ingeniería Carmona Carvajal SAS

Total Obra + Interventoría 3.461.233.731

Construcción \$3.275.698.691

Interventoría \$185.535.040

Meta Física:

Vía: 6,810 m2 en 700 ml

Andenes: 3.700 m2
Total Personas en Obra: 65

Valor adicional

\$18.948.311

% del personal de la región: 93%



Proyectos adjudicados 2013, ejecutados 2014

Calle 50 – Rehabilitación vial + Andenes

ENTRE CARRERA 19 Y GLORIETA LOS NARANJOS:



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Proyecto ejecutado 2014

Tramo Calle 26 - Rehabilitación Vial

Calle 26: iniciando en la carrera 18 y finaliza en la carrera 13




Inversión:

\$2.868.316.172
Millones

Total Personas en Obra: **57**

% del personal de la región:
100%

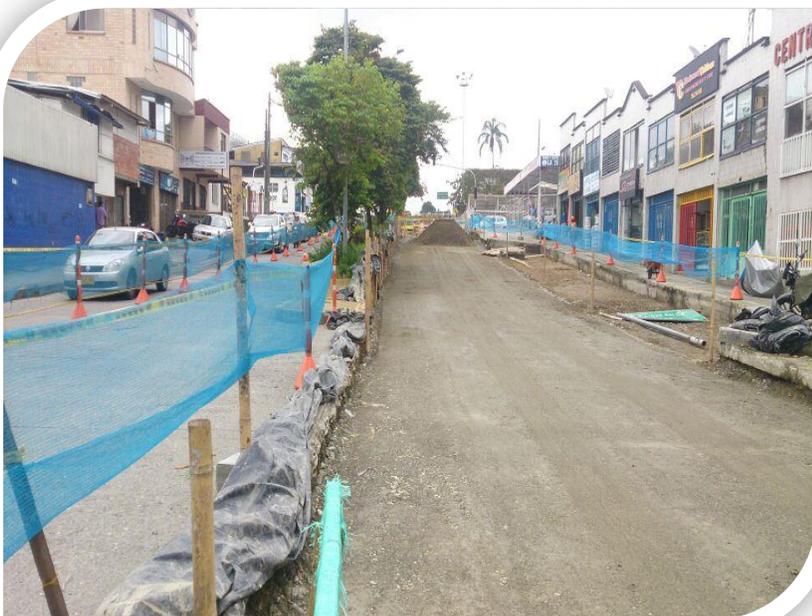

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

PROYECTOS EJECUTADOS 2014

PROYECTOS 2014 ADJUDICADOS	VALOR	INICIA	TERMINA
CIRCUITO SAGRADA FAMILIA - REHABILITACIÓN VIAL	\$5.007.495.317	21-Abr_14	04-Ago-14
CIRCUITO TERMINAL - REHABILITACIÓN VIAL	\$4.839.178.173	21-Abr_14	04-Ago-14
ANDENES TRAMO 3 CENTRO	\$2.243.431.010	26-May_14	08-Oct-14
CARRERA 19 TRAMO NORTE - REHABILITACIÓN VIAL	\$11.404.797.298	21-Abr-14	10-Dic-14
TOTAL	\$23.494.901.798		

Circuito Sagrada Familia - Rehabilitación Vial

Total Obra + Interventoría	\$5.007.495.317	Duración
Construcción	\$4.706.254.917	4 meses
Interventoría	\$301.240.400	5 meses

Construcción: Consorcio Amable la Minorista

Interventoría: Consorcio WCF Ingenieros

Meta Física: Vía: 1,51 Km

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Esta rehabilitación vial incluye 3 tramos:

- **Sagrada familia**
- **Minorista**
- **Calle 26 entre Cra 13 a 18**



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co



twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Tramo Sagrada Familia - Rehabilitación Vial

Comprende la calle 9 entre carreras 14 y 15, carrera 15 entre calle 9 y 11 y calle 11 entre carreras 15 y 19

Total Personas en Obra: 34

% del personal de la región: 100

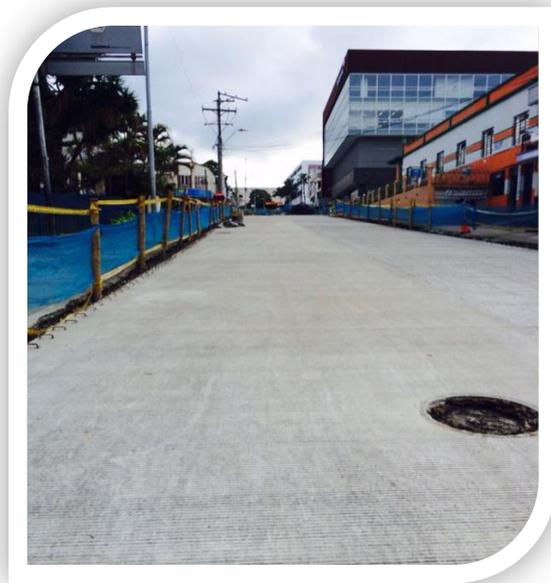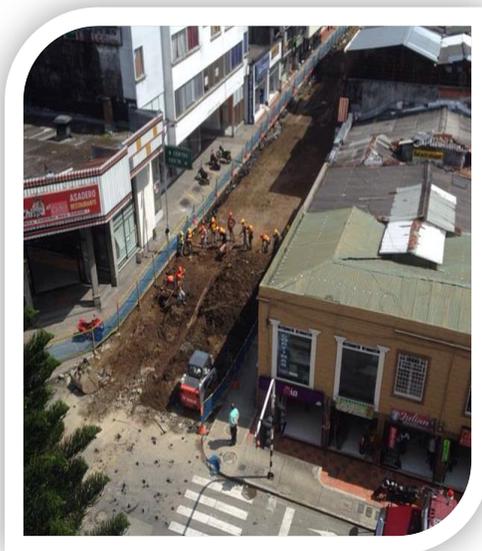

Inversión:

1.124.720.719

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Tramo Minorista- Rehabilitación Vial

Iniciando en la calle 24 sector de la plaza de mercado la Minorista y termina en la calle 21

Durante



Inversión:

\$ 713.218.026 Millones

Total Personas en Obra: **27**

% del personal de la región:

100%

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Circuito Terminal - Rehabilitación vial

Total Obra + Interventoría	\$4.839.178.173	Duración
Construcción	\$4.546.298.183	4 meses
Interventoría	\$292.879.990	5 meses

Construcción: CONSORCIO CONSTRUSOCIAL
AMABLE 06

Interventoría: CONSORCIO PROSPERIDAD

Esta rehabilitación vial incluye 3 tramos:

- **Circuito terminal**
- **Calle 50 entre Cra 18 y 19**
- **Arenales**

Meta Física:

Vía: 1,50 Km

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Tramo Terminal - Rehabilitación vial



Inversión:

**\$2.162.000.000
Millones**

Calle 35 entre carrera 18 y 19.
Calle 35 desde la salida del terminal de transporte hasta la carrera 23. Carrera 23 entre calles 35 y 36. Carrera 22 entre calles 35 y 36. Calle 36 desde la carrera 24 hasta la carrera 18.

Total Personas en Obra: **32**

% del personal de la región: **85%**

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Tramo Calle 50 entre Cra 18 y 19 - Rehabilitación vial



Inversión:

\$ 273 Millones



Total Personas en Obra: 14

% del personal de la región: 97%

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Tramo Arenales - Rehabilitación vial

Iniciando en la esquina de la planta de concretos premezclados Argos (parte posterior) hasta la intersección con la carrera 18 (sin incluir la intersección)

Total Personas en Obra: 35

% del personal de la región: 87%



Inversión:

\$2.112.112.190

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co


Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Tramo Arenales - Rehabilitación vial

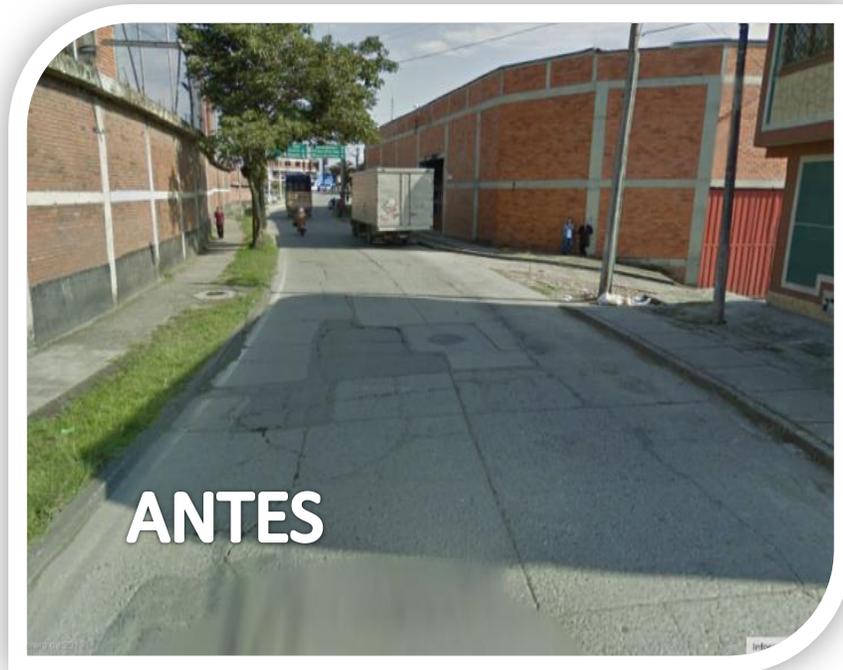

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Carrera 19 tramo Norte - Rehabilitación vial

Carrera 19 desde la glorieta Vásquez Cobo (sin incluir la glorieta) hasta la intersección con la calle 10 norte (sin incluir la intersección)

Total Obra + Interventoría	\$11.404.797.298	Duración
Construcción	\$10.756.278.418	10 meses
Interventoría	\$648.518.880	11 meses

Construcción: CONSORCIO CIUDAD MILAGRO 009

Interventoría: CONSORCIO ARMENIA 2014

Meta Física:

Vía: 3,2 Km

Total Personas en Obra: 35

% del personal de la región: 87%

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co


Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Carrera 19 tramo Norte - Rehabilitación vial

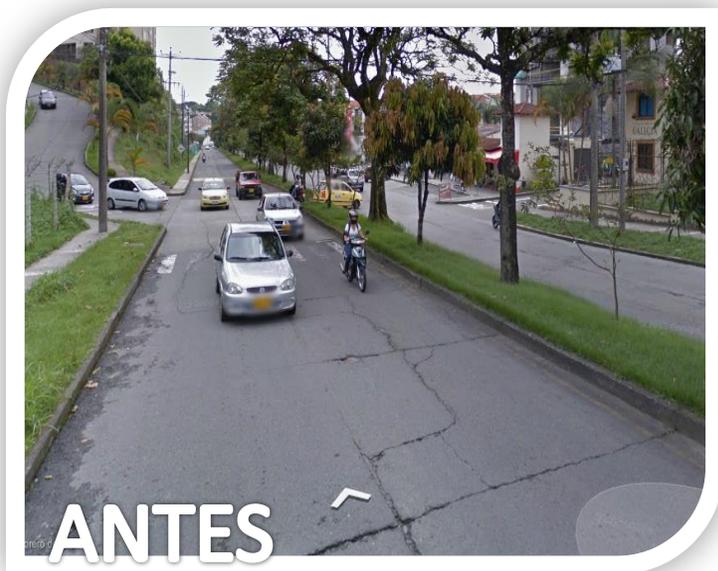

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Andenes Tramo 3 Centro

Carrera 15 entre calles 12 y 21, Carrera 16 entre calles 12 y 15 y Calles 12 a 21 entre carreras 14 y 16

Total Obra + Interventoría	\$2.243.431.010	Duración
Construcción	\$2.088.379.610	5 meses
Interventoría	\$155.051.400	6 meses

Construcción: CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA SAS

Interventoría: INGENIERIA Y ESTUDIOS LTDA

Meta Física:

Andenes: 8,800 m²

Total Personas en Obra: 50

% del personal de la región: 90%

Andenes Tramo 3 Centro Carrera 15



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

INVERSIÓN COMPARATIVA



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
 twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

CONSOLIDADO OBRAS AMABLE

PROYECTOS ADJUDICADOS 2013 Y EJECUTADOS 2014

OBRA	TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA	META FÍSICA:	TOTAL PERSONAS EN OBRA	% DEL PERSONAL DE LA REGIÓN
Calle 16 y Carrera 13 - Rehabilitación vial + Andenes	\$ 5.043 Millones	Vías 5.664 m ²	190	85%
		Andenes 13.400 m ²		
Calle 50 - Rehabilitación vial + Andenes	\$ 3.461 Millones	Vías 6.810 m ²	65	93%
		Andenes 3.700m ²		

PROYECTOS ADJUDICADOS 2014

OBRA	TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA	META FÍSICA:	TOTAL PERSONAS EN OBRA	% DEL PERSONAL DE LA REGIÓN
CIRCUITO SAGRADA FAMILIA				
Tramo Sagrada Familia Rehabilitación Vial	\$1.125 Millones		34	
Calle 26 Rehabilitación Vial	\$2.868 Millones	Vías 1,51 km	57	100%
Tramo Minorista Rehabilitación Vial	\$ 713 Millones		27	
CIRCUITO TERMINAL				
Tramo Terminal Rehabilitación Vial	\$ 2.162 Millones		32	85%
Tramo Calle 50 entre Carrera 18 y 19 Rehabilitación Vial	\$ 273 Millones	Vías 1,50 km	14	97%
Arenales Rehabilitación Vial	\$ 2.112 Millones		35	87%

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

PROYECTOS ADJUDICADOS 2014

OBRA	TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA	META FÍSICA:	TOTAL PERSONAS EN OBRA	% DEL PERSONAL DE LA REGIÓN
CARRERA 19 TRAMO NORTE - REHABILITACIÓN VIAL	\$11.405 Millones	Vías 3,2 km	35	87%
ANDENES TRAMO III CENTRO	\$2.243 Millones	8,800 m ²	50	90%

CONSOLIDADO

OBRA	META FÍSICA:
REHABILITACIÓN VIAL	7,7 km
ANDENES	25.900 m ²
TOTAL PERSONAS EN OBRA	539

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

EJECUCIÓN DE OBRAS VIGENCIA 2015

6. AVANCE PROYECTOS

Avance de obras por Componente SETP ARMENIA

Paraderos con Espacio Público (PEP)



PEP Mirador de la secreta



PEP Coliseo del Café

Rehabilitaciones Viales



Calle 10 norte



Manantiales



Av. primero de mayo



Carrera 19 tramo sur



Carrera 19 tramo norte



Terminal



Cra 13 centro



Arenales



Calle 50 tramo1



Sagrada Familia



Calle 26



Villa Hermosa

- Calle 50 entre Cra 18 y 19
- Sector La Minorista
- Cra 18 centro (en ejecución)

Renovación de andenes



Carrera 13



Carrera 16



Carrera 17



Calle 50 tramo1

- Cra 18 centro y calles conectoras (en ejecución)

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Rehabilitación vial Carrera 18 tramo Centro – Renovación de andenes tramo 5

Total Obra + Interventoría	\$6.904.881.040.70
Construcción	\$6.502.094.240,70
Interventoría	\$402.786.800



Meta Física:

Construcción: CONSORCIO VIAL CRA 18

Vía: 1,8 Km

AVANCE 21%

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

27% Avance

COMPONENTE OPERACIONAL


Consultoría estructuración técnica, legal y financiera SETP Armenia y sus fases de implementación



CONSULTORIA	VALOR	
Estructuración técnica, legal y financiera SETP Armenia y sus fases de implementación.	Consultor: TRANSCONSULT	968.918.310,00
	Interventoría: CONSORCIO MOVILIDAD ARMENIA	225.011.000,00

Consultoría red semafórica y centro de control

DIAGRAMA GENERAL : SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE RED SEMAFORIZADA DE ARMENIA

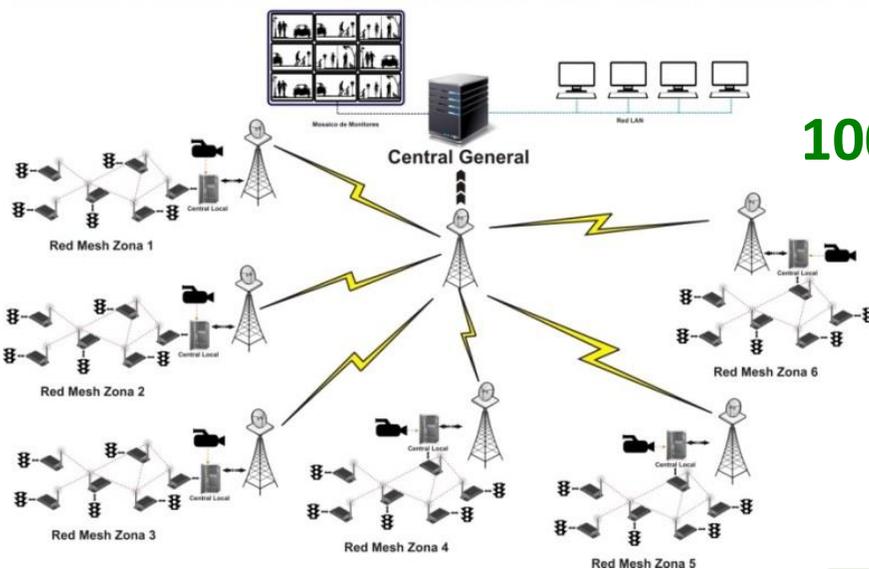

100% Avance

CONSULTORIA	VALOR
Elaboración de diseños definitivos (técnicos, operativos, legales y financieros) para la implementación del sistema de semaforización y su centro de control para la ciudad de Armenia.	Total: \$249.284.000,00

Centro Administrativo Municipal CAMI, Piso 5, Tel. (6) 741 7100 ext. 125

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

DISEÑO DE PROYECTOS A EJECUTAR 2015



Renovación de andenes tramo 4

Total Obra + Interventoría*	\$1.115.376.622
Construcción	\$1.010.504.212
Interventoría	\$104.872.410



PLAZO DE EJECUCIÓN:

8 MESES

Meta Física:

3.000 m2

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

REHABILITACIÓN VIAL

CRA 18 TRAMO SUR



Total Obra + Interventoría*	\$11.273.108.090
Construcción	\$10.654.366.382
Interventoría	\$618.741.708

PLAZO DE EJECUCIÓN:

8 MESES Meta Física:

36.626,14 m²

Longitud 2,11 km

PROYECTO VIAL CALLE 50 TRAMO II



Meta Física:

Vía: 1,7 Km

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Total Obra + Interventoría*	\$11.282.246.492
Construcción	\$10.544.155.600
Interventoría	\$738.090.892



FECHA PROYECTADA DE INICIO:

11/15

PLAZO DE EJECUCIÓN:

8 MESES

PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO **LOS NARANJOS**

Construcción Obra:

Constructora Diez Cardona

Interventoría: En adjudicación



Total Obra + Interventoría*	\$1.431.809.327
Construcción	\$1.306.026.168
Interventoría	\$125.783.159,0

PLAZO DE EJECUCIÓN:

5 MESES



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

REHABILITACIÓN VIAL MONTEPRADO - EL SILENCIO

Total Obra + Interventoría*	\$1.003.514.165
Construcción	\$906.137.003
Interventoría	\$97.377.162



PLAZO DE EJECUCIÓN:

4 MESES

Meta Física:

2.537,88 m2



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03


24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

IMPACTOS EN CULTURA CIUDADANA

«YO SOY AMABLE»

SETP - ARMENIA



Fuente:
 archivo Area de comunicaciones
 Amable EICE
 * Los datos suministrados corresponden
 al número de personas impactadas
 con la campaña "yo soy Amable" y las
 socializaciones en actos de vecindad.

* Los datos 2015
 no incluyen contratación
 de plan de comunicaciones
 a presentarse en junta
 directiva los próximos días



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
 twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

EMPLEOS GENERADOS


SETP – ARMENIA

2012 – 2014 – JUNIO/2015

*Los datos suministrados corresponden al número de empleos (x personas) contratadas a través del desarrollo del sistema estratégico de transporte público en la ciudad de Armenia.



CIFRAS DE EMPLEO / JUNIO 30 DE 2015

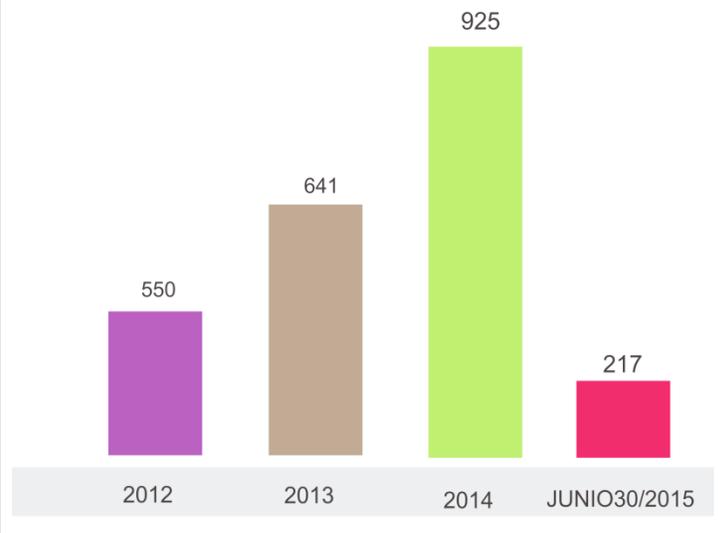

Fuente:
 archivo contratistas Amable E.I.C.E.
 Contratistas de obra
 Contratistas Interventoría
 Empleos indirectos



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
 twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

TABLA DE GESTIÓN DE RECURSOS AMABLE 2015

OBRA , ACTIVIDAD O GESTION	INVERSION MUNICIPIO	RECURSO
REHABILITACIÓN VIAL Y RENOVACIÓN DE ANDENES EN LA CARRERA 18 Y CONECTORAS, SECTOR CENTRO DE ARMENIA, DENTRO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP.	\$ 6.502.094.240,70	SOBRETASA A GASOLINA
ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS DE INGENIERIA PARA LAS VÍAS URBANAS CARRERA 20, CALLE 50 TRAMO II Y MONTEPRADO - EL SILENCIO, DENTRO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP.	\$ 82.041.000	SOBRETASA A GASOLINA
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES EN LA CARRERA 18 Y CONECTORAS, SECTOR CENTRO DE ARMENIA, DENTRO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP.	\$ 402.784.480,00	SOBRETASA A GASOLINA
ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP DE ARMENIA, INCLUYENDO LA DEFINICIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE SUS FASES DE IMPLEMENTACIÓN.	\$ 968.918.310,00	SOBRETASA A GASOLINA
SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS QUE REQUIERA AMABLE PARA EL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS VINCULADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP.	\$ 18.000.000	SOBRETASA A GASOLINA
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS A INTERVENIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP.	\$ 729.000	SOBRETASA A GASOLINA
COMPRAVENTA DE SOFTWARE PARA LA EMPRESA AMABLE E.I.C.E.	\$ 10.454.471	SOBRETASA A GASOLINA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CORREO CERTIFICADO PARA LA ENTREGA DE OFERTAS DE COMPRA Y NOTIFICACIONES DE PREDIOS A INTERVENIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP.	\$ 1.485.000	SOBRETASA A GASOLINA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES DE LOS PREDIOS A INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	\$ 5.167.800	SOBRETASA A GASOLINA
TOTAL	7,991,674,301,70	

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123


Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Cuadro ejecución presupuestal de obras SETP Armenia

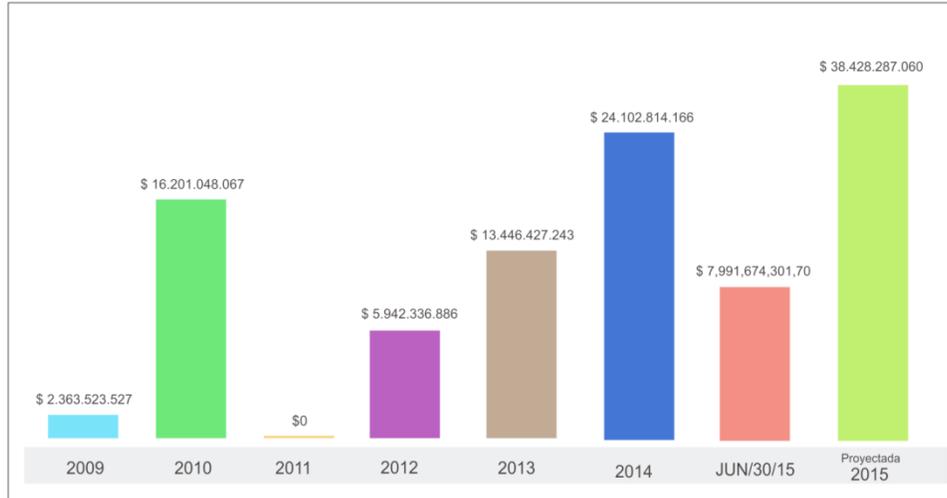

Anotaciones:

- Se incluye en 2014 y 2015 Red semaforica SGCF
- Información tomada del POAT versión 19 de mayo de 2015.

Ejecución presupuestal ejecutado 2009 a JUN/30/15: **\$ 70.047.824.190,70**

Ejecución presupuestal proyectada 2009 a DIC/31/15: **\$ 100.484.436.949**

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

INFORME DE ACTIVIDADES GESTIÓN AMBIENTAL AMABLE E.I.CE.

Durante el período del 13 de Febrero de 2012 al 19 de Septiembre de 2013, se ha realizado el acompañamiento técnico de los procesos y actividades Ambientales a la Gerencia de Amable E.I.C.E.

- ❖ Se diseñó el formato de listas de chequeo, se realizaron visitas técnicas a los predios a intervenir por las obras, algunas de estas visitas fueron acompañadas por personal de la subdirección de Planeación municipal, se realizó el inventario forestal y su localización en planos de los predios, se elaboró y presentó el estudio técnico y la solicitud de tala ante CRQ de las obras donde se ven afectado el medio ambiente.
- ❖ Se entabló comunicación permanente con el consultor en Gestión Ambiental de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio de Transporte, al cual se allegaron los formatos del estado ambiental de las obras para el SETP de Armenia, se trataron las exigencias y lineamientos del BID respecto a la elaboración e implementación de los planes de manejo Ambiental y respecto a la elaboración del presupuesto “Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental PIPMA”, se realiza recorrido de reconocimiento de las obras de infraestructura asociadas al SETP Amable, se llevó a cabo socialización de la Gestión Ambiental, se adelantaron temas de exploración de alternativas de inversión para recursos del Clean Technology Fund. Se analizaron y respondieron todos los requerimientos Ambientales expresados por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS del ministerio de Transporte para los Planes de Manejo ambiental (PMA) de las obras a realizar, para los cuales se adicionaron:
 - Actividades constructivas exclusivas de cada obra.
 - Mapa de diseño conceptual del SETP con el tramo a intervenir.
 - Cronograma Ambiental de las obras.
 - Evaluación de los factores ambientales impactados y estimación de afectaciones en términos cuantitativos (Volumen estimado de escombros que se generarán, cantidad de maquinaria que operará en la obra, número de baterías sanitarias portátiles previstas, inventario de sumideros, entre otros)
 - Esquema de identificación de los componentes del PMA y de los subprogramas que lo constituyen.
- ❖ Se realizó revisión documental del tema Ambiental, se elaboraron los Planes de Manejo Ambiental con las respectivas evaluaciones de Impacto Ambiental, Planes de Contingencia, Plan de Seguimiento (Formatos y Listas de chequeo), programa Manejo de tránsito Peatonal y presupuestos para los Programas de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA) cumpliendo con las exigencias establecidas por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS del ministerio de Transporte para los Planes de Manejo ambiental (PMA) de las Obras ejecutadas.
- ❖ Se evaluaron los Programa de Implementación del PMA (PIPMA), el reglamento de higiene y seguridad industrial, y los informes mensuales de interventoría Socio-Ambientales y SISO de las obras realizadas del SETP, al igual qu se revisó el programa de Salud ocupacional y Seguridad Industrial y el

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

cronograma SISO de cada obra, se solicitó a las mismas las respectivas correcciones para su aprobación, además, se realizaron **Visitas técnicas** a fin de realizar el seguimiento Ambiental y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO) y se asistió a los **comités Socio-Ambientales** programados cada 15 días de las obras en mención, consignando en actas de visita técnica las observaciones y exigencias para el cumplimiento del PMA y registrando en Actas y asistencias los comités socio-ambientales de Obra.

- ❖ Se llevaron a cabo reuniones con representantes del Departamento de Planeación municipal, la subdirección de control y seguimiento de la CRQ y con la Gerente, Subgerente y Contratista ambiental de AMABLE donde se establecieron los requisitos para el cumplimiento de las compensaciones forestales y para los mantenimientos de las mismas y se concertó realizar las solicitudes de tala directamente con CRQ para agilizar los trámites, también se realizó solicitud de evaluación de afectación ante el Departamento Administrativo de Planeación municipal sobre la afectación del “LOTE LA MARIA” en el Barrio el Limonar ya que ha perdido las características de suelo de protección como aparece en el POT, esto a fin de redefinirlo como suelo de expansión urbana y determinar la no afectación del mismo definiendo la localización y retiro vial del proyecto “Perimetral del Café” para establecer si afecta o no el proyecto de AMABLE “Terminal de ruta el Limonar. Se realizó estudio de especies arbóreas y vegetales que cumplan con exigencias físicas y con los lineamientos del Manual del Árbol Urbano de Planeación municipal de Armenia para establecer en las obras a ejecutar por la Empresa AMABLE y que no vayan a afectar la infraestructura a construir.
- ❖ Se realizó informe de las especies forestales sembradas como compensación por parte de la obra **PEP Mirador de la Secreta**, donde se evaluó: Estado fitosanitario, densidad de follaje, Variables Dasonométricas, emplazamientos, distancia de siembra. Se tomó registro fotográfico y se realizaron las recomendaciones respectivas al contratista, además, se han venido realizando visitas técnicas mensuales de inspección para supervisar el estado fitosanitario de las especies arbóreas sembradas como compensación forestal por la tala de 5 especies en la Obra PEP mirador de la Secreta, compensación que fue llevada a cabo en el Coliseo del Café y al Interior del PEP Coliseo (se sembraron en total 50 árboles), y se sembraron los otros 10 por compensar al interior del PEP Mirador de La Secreta, para un total de 60 árboles compensados, además, se realizó visita con técnico de la Corporación Autónoma Regional del Quindío al Coliseo del Café para que dicha entidad hiciera el control y seguimiento de las especies vegetales sembradas como compensación, también se ha evaluado el material vegetal sembrado en los andenes de la Carrera 17 y de las 12 especies arbóreas sembradas como compensación forestal por la tala de 4 especies en el separador vial de la urbanización Villa Hermosa; con estas visitas se verifica que el contratista cumpla con los mantenimientos requerimientos por AMABLE E.I.C.E y que las especies vegetales estén en óptimas condiciones (se verificó Estado fitosanitario, densidad de follaje, Variables Dasonométricas, emplazamientos, distancia de siembra).



Seguimiento a Mantenimientos en Coliseo del Café y Andenes de la Carrera 17 del centro

- ❖ Se Presentó informes ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, de las compensaciones forestales realizadas por las obras “Rehabilitación vial Urbanización Villa Hermosa” y por la obra “PEP Mirador de la Secreta”. Se realizó el inventario forestal y se elaboró el estudio técnico para la solicitud de tala del material arbóreo localizado en el proyecto CI 21 entre carreras 19 y 23 y se presentó a dicha entidad, también se realizó el Inventario Forestal, localización en planos y Estudio y caracterización Ambiental para solicitar el Permiso de Aprovechamiento forestal ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) de las obras: Urbanización Villa Hermosa, Aeropuerto, Hospital, Andenes del Centro (Tramo 2 y Tramo 3), CI 50 Tramo 1 y Separador vial CI 21 entre Cr 19 y 23 y Se realizaron visitas técnicas en conjunto con CRQ a dichos sitios.

Localización en Plano de la Intervención forestal en andenes del Centro Tramo 3

- ❖ Se realizaron reuniones periódicas con la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ en la se trataron temas como la socialización del plan de descontaminación por Ruido donde se realizó la evaluación del plan de acción y se estableció el compromiso de la empresa AMABLE para apoyar el programa de descontaminación, también se hizo entrega de las socializaciones realizadas en el Mirador de la Secreta y la Urbanización Villa Hermosa. Se realizaron visitas técnicas en conjunto con CRQ y Arquitectos del Área técnica de AMABLE a los Andenes del centro Tramo 2 (Carrera 14 entre Calles 21 y 24 y Calles 21, 22, 23 y 24 entre carreras 13 y 16), Tramo 3 (Carrera 15 entre Calles 12 y 21) y Calle 50 tramo 1, a fin de efectuar la

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

individualización para cada una de las especies de Palmas solicitadas para intervención, verificando su estado actual y su afectación a la infraestructura aledaña, además, se referenció la necesidad de tala de conformidad con los diseños estructurales elaborados por la empresa AMABLE E.I.C.E. para los andenes del Centro y se acordó el bloqueo y traslado de algunas palmas que previamente se habían evaluado con la CRQ y se definió como óptimo el traslado de algunas que están en crecimiento, por último, se trataron los temas de localización de las especies arbóreas que se establecerán como compensación y se requirió a la CRQ un listado de especies para establecer como compensación y que cumpla con las exigencias de las obras a ejecutar por la empresa AMABLE.

- ❖ Se realizó Campaña de cultura ciudadana y encuestas a fin propender por el cuidado del espacio público, las obras de AMABLE y el cuidado del medio ambiente en el municipio de Armenia.



- ❖ Se Recopilaron los soportes de Gestión Ambientales de ejecución de obras, se almacenaron en medio magnético y se hizo entrega de estos en DVD. Los soportes incluyen: Oficios, Planes de Manejo Ambiental, Registros fotográficos, Planos ambientales, Actas de visitas técnicas, Estudios ambientales para aprovechamientos forestales, inventarios forestales, Informes de Gestión, Informes de actividades Ambientales.
- ❖ Se realizaron visitas con el área Técnica de AMABLE a fin de Asesorar y evaluar el tema ambiental con la disposición de escombros que se realizará en dicho lugar.
- ❖ Se ha presentado informe trimestral a la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) via email, del avance de los procesos en temas ambientales, en este se informó el estado de los procesos, ubicación y presupuesto del PMA para cada uno.



GESTIÓN SOCIAL Y DE COMUNICACIONES

El Sistema Estratégico de Transporte Público ha propendido por la consolidación de una unidad de trabajo que parte desde el área social y se proyecta y complementa con el área de comunicaciones, consolidando de esta manera una gestión articulada que promueve el acompañamiento a la comunidad en cada uno de los proyectos diseñados por la empresa, antes, durante y después; y el posicionamiento de la misma a través de los diferentes medios de comunicación interna y externa, permitiendo un amplio impacto y reconocimiento en los diferentes escenarios de la ciudad.

Es así, como se diseñaron diferentes estrategias y actividades que han contribuido con uno de los componentes del sistema: *Diseño de imagen corporativa, socialización, educación y cultura ciudadana.*

- **SOCIALIZACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO**

Llegar a los diferentes sectores de la comunidad eficientemente es un objetivo que se ha logrado con la consolidación de diversos conversatorios sobre el Sistema Estratégico de Transporte Público y cada uno de sus componentes. A través de ellos se ha concientizado a la comunidad sobre los diferentes procesos, el impacto de las intervenciones y los medios a su alcance para plantear sus inquietudes y sugerencias.

2012	
SECTORES	PROMEDIO
Líderes y comunidad de las diferentes comunas de la ciudad Cámara de Comercio Edeq Tinto Institución Educativa La Pavona Grupo La Tercera Edad La Pavona Plaza Minorista	1000 personas

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Institución Educativa Cristóbal Colón Sociedad de Ingenieros Fenalco Epa	
2013	
Comerciantes Medios de Comunicación Administración Municipal Estudiantes de la Esap Estudiantes de Universidad Tecnológica de Tunja Pacto Ciudadano con Cámara de Comercio Secretaría de Educación Rectores de Instituciones Educativas	500 personas

- **SENSIBILIZACIÓN EN ÁREAS DE INFLUENCIA**

Uno de los procesos más efectivos es la visita personalizada a través de la cual se entrega información a los habitantes de cada sector, en que se ejecutan obras de la entidad y se informa a la comunidad todo lo inherente a la misma.

2012		
SECTOR	OBRA	TOTAL UNIDADES FAMILIARES SOCIALIZADAS
Calle 26	Rehabilitación vial y renovación de andenes	550
Barrio La Pavona	Rehabilitación Vial	
Carrera 17 entre calles 17 y 21; y Calle 16 desde la carrera 13 hasta la carrera 16		
Parque Fundadores	Instalación de paraderos M10	
Centro de Salud La Milagrosa, Cancha de tenis, Fincas, Sorrento, bomberos, Coliseo	Paradero con Espacio Público Coliseo del Café	
2013		
Carrera 16, Carrera 13 y conectoras	Rehabilitación vial y renovación de andenes en diferentes sectores del centro de la ciudad	2100
Calle 10 norte	Rehabilitación vial Calle 10 Norte desde la carrera 14 a la carrera 19	
Carrera 14	Mantenimiento de la malla vial de la carrera 14	
comerciantes	Renovación del centro de la ciudad	

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Carrera 19	Carril solo bus de la 26 hasta 3 esquinas	
------------	---	--

- **ACOMPAÑAMIENTO EN EJECUCIÓN DE OBRAS**

-

Durante los procesos de ejecución de obra se realizan las respectivas visitas y acompañamiento a los comités técnicos de obra, con el fin de supervisar los avances de la misma y constituir un canal de comunicación entre el contratista y la comunidad.

2012
Rehabilitación vial Avenida Primero de Mayo Rehabilitación vial Manantiales Rehabilitación Vial Villa Hermosa Paradero con Espacio Público Mirador de la Secreta Paradero con Espacio Público Coliseo del Café Proyecto Piloto de renovación de andenes en la Carrera 17
2013
Rehabilitación vial calle 10 norte Rehabilitación vial calle 19 tramo sur Rehabilitación vial y renovación de andenes en diferentes sectores del centro de la ciudad
2014
Renovación de Andenes en diferentes sectores del centro de Armenia, tramo 3, en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP Rehabilitación Vial de la Carrera 19 Tramo Norte, en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP Armenia Rehabilitación vial de los sectores: Circuito Terminal - Arenales - Calle 50 Entre Carreras 18 y 19, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP - Armenia Rehabilitación Vial de los sectores: Circuito Sagrada Familia - Calle 26 entre carreras 18 y 13 - Sector la Minorista, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP - Armenia
2015
Rehabilitación Vial y Renovación de Andenes en la carrera 18 y conectoras, sector centro de Armenia, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP. Construcción del paradero con espacio público Los Naranjos y obras complementarias, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP de Armenia.

- **ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA**

La cultura ciudadana es un componente fundamental en cada una de las obras que realiza la entidad, toda vez que permite el mantenimiento de las mismas, no sólo para el momento en que se implemente el Sistema con cada uno de sus componentes, sino para que los usuarios se apropien de las obras que embellecen la ciudad y aporten su granito de arena en el mantenimiento.

- **PACTO CIUDADANO:** Estrategia desarrollada en el 2012, que

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

permitió acercar a la comunidad a las diferentes obras que la entidad estaba entregando. Se trata de un documento que estas personas firmaron para ayudar a cuidar las obras.

2012	
SECTOR	PROMEDIO
CARRERA 17	350
PEP COLISEO	
MIRADOR	

- **YO SOY AMABLE:** Estrategia dirigida a los estudiantes de grado décimo y once de los colegios e instituciones educativas de la ciudad, para convertirlos en multiplicadores de la estrategia en sus entornos más cercanos.

2013	
SECTOR	
COOBURQUIN	2500 estudiantes
I.E. SANTA TERESA DE JESÚS	
I.E. ENRIQUE OLAYA	
I.E. CAMILO TORRES	
I.E. INEM	
COLEGIO JORGE ISAAC	
COLEGIO SANTO REY	
COLEGIO SAN JOSÉ	
I.E. CASD	
I.E. RUFINO CENTRO	
I.E. CÁMARA JUNIOR	
I.E. EUDORO GRANADA	
I.E. NORMAL SUPERIOR	
I.E. CRISTÓBAL COLON	

• SONDEOS DE SATISFACCIÓN

Es de vital importancia para la entidad hacer mediciones periódicas que permitan identificar y acercar las ideas de la comunidad a las instancias que correspondan, con el fin de tenerlas en cuenta y brindarles acompañamiento y solución en la medida de las competencias de cada uno.

SECTOR	MUESTRA
CARRERA 17	100
PEP COLISEO	30
PEP LA SECRETA	30
PEP HOSPITAL DEL SUR	62

• PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO

Se construyeron diferentes piezas publicitarias que permitieron un acompañamiento en las diferentes estrategias y socializaciones desarrolladas por

la entidad.

2012 - 2015
Afiches Volantes Plegables Diplomas Tarjetas lord Revistas Informables Calendarios Mapas guía Adhesivos Pendones Publicaciones Volantes de obra Volantes de socialización Merchindising (Reglas, lapiceros)

- **MEDIOS DE DIFUSIÓN TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS PROPIOS**

- **Programa Armenia Amable:** magazín que se emite los viernes a las 3:30 pm por la UFM 102.1
- **Página Web www.armeniaamable.gov.co:** la cual se actualiza constantemente con la información relacionada con el proyecto SETP
- **Informable:** publicación trimestral en la que se entrega información sobre los diferentes proyectos de la entidad. En ella participan con artículos, los diferentes profesionales contratistas.
- **Redes sociales:** Twitter (@amablesetp) y Facebook (amablesetp)

- **PLAN DE MEDIOS**

RELACIÓN CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2012				
ITEM	CONTRATISTA	OBJETO	TIPO DE CONTRATO	VALOR
1	No. De contratos: 7	Alquiler de pauta Publicitaria en emisoras con cobertura local para la divulgación de mensajes institucionales y de avance en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público	EMISORAS	15.120.000,00
2	No. De contratos: 1	Prestación de servicios de perifoneo de mensajes institucionales relacionados con los programas y proyectos desarrollados por	PERIFONEO	1.800.000,00

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

		AMABLE E.I.C.E, dentro de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.		
3	No. De contratos: 8	Alquiler de espacio (Pauta Publicitaria) en prensa escrita para la divulgación de mensajes institucionales en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público	PRENSA ESCRITA	20.600.000,00
4	No. De contratos: 20	Pauta en programas radiales para la divulgación al público en general de mensajes institucionales del Sistema Estratégico de Transporte Público y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación	PROGRAMA RADIAL	21.000.000,00
5	No. De contratos: 13	Divulgación al público en general de mensajes institucionales en Radio para la promoción y socialización del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP	RADIO	19.500.000,00
6	No. De Contratos: 6	Pauta publicitaria televisiva para la divulgación al público en general de mensajes institucionales para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público	TELEVISION	14.680.000,00
	TOTAL CONTRATOS: 55	VALOR TOTAL:		92.700.000,00

RELACIÓN CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2013				
ITEM	CONTRATISTA	OBJETO	TIPO DE CONTRATO	VALOR
1	No. De contratos: 4	Alquiler de Espacio publicitario en programas radiales con cobertura local de amplia difusión, para la realización de entrevistas y cuñas los fines de semana, que permitan el posicionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público y de avance de los proyectos de infraestructura	PROGRAMA RADIAL	16.500.000,00

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

		desarrollados en su implementación.		
2	No. De contratos: 6	Pauta en programas radiales para la divulgación al público en general de mensajes institucionales del Sistema Estratégico de Transporte Público y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PROGRAMA RADIAL MENSAJES INSTITUCIONALES	12.375.000,00
3	No. De contratos: 2	Alquiler de pauta publicitaria en periódicos para la divulgación de mensajes institucionales en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.	PRENSA ESCRITA	8.054.000,00
4	No. De contratos: 3	Pauta publicitaria televisiva para la divulgación al público en general de mensajes institucionales para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público	TELEVISIÓN	10.350.000.00
5	No. De contratos: 4	Divulgación de mensajes en programas radiales para el posicionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público que evidencien la responsabilidad ambiental por parte de la empresa AMABLE E.I.C.E y el avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	MENSAJES RADIALES	16.499.520,00
6	No. De Contratos: 3	Difusión de secciones en vivo del proyecto SETP en programas radiales con énfasis en la comunidad para el posicionamiento de la imagen institucional y del avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	DIFUSIÓN EN VIVO	12.374.856,00
7	No. De Contratos: 2	Alquiler de pauta publicitaria en periódicos para la divulgación de mensajes institucionales en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte	PERIÓDICO	16.300.000.00

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

		Público.		
	TOTAL CONTRATOS: 24	VALOR TOTAL:		92.453.376,00



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

RELACIÓN CONTRATACIÓN PUBLICIDAD 2014				
ITEM	No.	OBJETO	TIPO DE CONTRATO	VALOR
1	001	Alquiler de pauta publicitaria en revistas de circulación local, emitidas con una periodicidad no mayor a tres meses, para la divulgación de mensajes institucionales en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público	ALQUILER PAUTA	5.688.000.00
2	002	Alquiler de pauta publicitaria en revistas de circulación local, emitidas con una periodicidad no mayor a tres meses, para la divulgación de mensajes institucionales en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público	ALQUILER PAUTA	5.688.000.00
3	003	Alquiler de pauta publicitaria en revistas de circulación local, emitidas con una periodicidad no mayor a tres meses, para la divulgación de mensajes institucionales en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público	ALQUILER PAUTA	5.688.000.00
4	004	Realizar actividades de promoción de contenidos audiovisuales que permitan la multiplicación televisiva de los diferentes proyectos que la empresa Amable ejecuta en la ciudad, para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público	PROMOCIÓN CONTENIDOS AUDIOVISUALES	14.260.000.00
5	005	Producción y ejecución de campañas de educación ciudadana que permitan a través de actividades lúdicas, generar una cultura amable en la comunidad en general, alrededor de las obras de infraestructura diseñadas para el funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público S.E.T.P	CAMPAÑAS EDUCATIVAS	15.600.000.00
6	006	Pauta en programas radiales para la promoción hacia la comunidad de mensajes institucionales del Sistema Estratégico de Transporte Público y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PAUTA RADIAL	2.250.000.00
7	007	Pauta en programas radiales para la promoción hacia la comunidad de mensajes institucionales del Sistema Estratégico de Transporte Público y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PAUTA PUBLICITARIA	2.250.000.00

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

8	008	Pauta en programas radiales para la promoción hacia la comunidad de mensajes institucionales del Sistema Estratégico de Transporte Público y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PAUTA PUBLICITARIA	2.250.000.00
9	009	Pauta en programas radiales para la promoción hacia la comunidad de mensajes institucionales del Sistema Estratégico de Transporte Público y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PAUTA PUBLICITARIA	2.250.000.00
10	010	Pauta en programas radiales para la promoción hacia la comunidad de mensajes institucionales del Sistema Estratégico de Transporte Público y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PAUTA PUBLICITARIA	2.250.000.00
11	011	Pauta en programas radiales para la promoción hacia la comunidad de mensajes institucionales del Sistema Estratégico de Transporte Público y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PAUTA PUBLICITARIA	2.250.000.00
12	012	Emisión de pauta publicitaria en televisión local o regional para la divulgación al público en general de mensajes institucionales para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público	PAUTA PUBLICITARIA	4.255.800.00
13	013	Emisión de pauta publicitaria en televisión local o regional para la divulgación al público en general de mensajes institucionales para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público	PAUTA PUBLICITARIA	4.255.800.00
14	014	Emisión de pauta publicitaria en televisión local o regional para la divulgación al público en general de mensajes institucionales para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público	PAUTA PUBLICITARIA	4.255.800.00
15	015	Alquiler de espacio publicitario en programas radiales con cobertura local de amplia difusión, para la realización de secciones radiales los fines de semana, en distintos medios, que permitan el posicionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PAUTA PUBLICITARIA	3.826.488.00

16	016	Alquiler de espacio publicitario en programas radiales con cobertura local de amplia difusión, para la realización de secciones radiales los fines de semana, en distintos medios, que permitan el posicionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PAUTA PUBLICITARIA	3.826.488.00
17	017	Alquiler de espacio publicitario en programas radiales con cobertura local de amplia difusión, para la realización de secciones radiales los fines de semana, en distintos medios, que permitan el posicionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PAUTA PUBLICITARIA	3.826.488.00
18	018	Difusión de Pautas en vivo del proyecto SEPT en programas radiales con énfasis en la comunidad para el posicionamiento de la imagen institucional y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PAUTA PUBLICITARIA	4.257.000.00
19	019	Difusión de Pautas en vivo del proyecto SEPT en programas radiales con énfasis en la comunidad para el posicionamiento de la imagen institucional y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PAUTA PUBLICITARIA	4.257.000.00
20	020	Difusión de Pautas en vivo del proyecto SEPT en programas radiales con énfasis en la comunidad para el posicionamiento de la imagen institucional y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PAUTA PUBLICITARIA	4.257.000.00
21	021	Difusión de Pautas en vivo del proyecto SEPT en programas radiales con énfasis en la comunidad para el posicionamiento de la imagen institucional y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PAUTA PUBLICITARIA	4.257.000.00
22	022	Alquiler de pauta publicitaria en periódicos con difusión local para divulgación de mensajes institucionales en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.	PAUTA PUBLICITARIA	7.502.000.00

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

23	023	Alquiler de pauta publicitaria en periódicos con difusión local para divulgación de mensajes institucionales en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.	PAUTA PUBLICITARIA	4.800.000.00
24	024	Difusión de menciones en televisión para el posicionamiento de la campaña de cultura ciudadana "YO SOY AMABLE", que permita el buen uso de los espacios en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.	PAUTA PUBLICITARIA	6.000.000.00
25	025	Difusión de menciones en televisión para el posicionamiento de la campaña de cultura ciudadana "YO SOY AMABLE", que permita el buen uso de los espacios en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.	PAUTA PUBLICITARIA	6.000.000.00
26	026	Divulgación de mensajes en programas radiales para el posicionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público que evidencien la responsabilidad ambiental de la empresa Amable E.I.C.E y el avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PAUTA PUBLICITARIA	3.933.820.00
27	027	Divulgación de mensajes en programas radiales para el posicionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público que evidencien la responsabilidad ambiental de la empresa Amable E.I.C.E y el avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PAUTA PUBLICITARIA	3.933.820.00
28	028	Alquiler de pautas publicitarias en periódicos con difusión local para la divulgación de mensajes institucionales en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.	PAUTA PUBLICITARIA	4.000.000.00
29	029	Divulgación de mensajes en programas radiales para el posicionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público que evidencien la responsabilidad ambiental de la empresa Amable E.I.C.E y el avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PAUTA PUBLICITARIA	3.933.800.00

30	030	Divulgación de mensajes en programas radiales para el posicionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público que evidencien la responsabilidad ambiental de la empresa Amable E.I.C.E y el avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PAUTA PUBLICITARIA	3.387.840.00
31	031	Divulgación de menciones radiales en programación general de emisoras con cobertura local en el municipio de Armenia para el posicionamiento de la campaña "YO SOY AMABLE" del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP	PAUTA PUBLICITARIA	7.200.000.00
32	032	Divulgación de menciones radiales en programación general de emisoras con cobertura local en el municipio de Armenia para el posicionamiento de la campaña "YO SOY AMABLE" del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP	PAUTA PUBLICITARIA	7.200.000.00
33	033	Divulgación de menciones radiales en programación general de emisoras con cobertura local en el municipio de Armenia para el posicionamiento de la campaña "YO SOY AMABLE" del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP	PAUTA PUBLICITARIA	7.200.000.00
34	034	Divulgación de menciones radiales en programación general de emisoras con cobertura local en el municipio de Armenia para el posicionamiento de la campaña "YO SOY AMABLE" del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP	PAUTA PUBLICITARIA	7.200.000.00
35	035	Divulgación de menciones radiales en programación general de emisoras con cobertura local en el municipio de Armenia para el posicionamiento de la campaña "YO SOY AMABLE" del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP	PAUTA PUBLICITARIA	7.200.000.00
36	036	Pauta institucional en programas radiales que permita impulsar en la comunidad el cuidado de cada una de las obras que la empresa Amable esta culminando en los diferentes sectores de la ciudad y dar a conocer el avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en la implementación del proyecto SEPT.	PAUTA PUBLICITARIA	1.750.000.00
37	037	Pauta institucional en programas radiales que permita impulsar en la	PAUTA PUBLICITARIA	1.750.000.00

		comunidad el cuidado de cada una de las obras que la empresa Amable esta culminando en los diferentes sectores de la ciudad y dar a conocer el avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en la implementación del proyecto SEPT.		
38	038	Pauta institucional en programas radiales que permita impulsar en la comunidad el cuidado de cada una de las obras que la empresa Amable esta culminando en los diferentes sectores de la ciudad y dar a conocer el avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en la implementación del proyecto SEPT.	PAUTA PUBLICITARIA	1.750.000.00
39	039	Pauta institucional en programas radiales que permita impulsar en la comunidad el cuidado de cada una de las obras que la empresa Amable esta culminando en los diferentes sectores de la ciudad y dar a conocer el avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en la implementación del proyecto SEPT.	PAUTA PUBLICITARIA	1.750.000.00
40	040	Pauta institucional en programas radiales que permita impulsar en la comunidad el cuidado de cada una de las obras que la empresa Amable esta culminando en los diferentes sectores de la ciudad y dar a conocer el avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en la implementación del proyecto SEPT.	PAUTA PUBLICITARIA	1.750.000.00
41	041	Pauta institucional en programas radiales que permita impulsar en la comunidad el cuidado de cada una de las obras que la empresa Amable esta culminando en los diferentes sectores de la ciudad y dar a conocer el avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en la implementación del proyecto SEPT.	PAUTA PUBLICITARIA	1.750.000.00
42	042	Pauta institucional en programas radiales que permita impulsar en la comunidad el cuidado de cada una de las obras que la empresa Amable esta culminando en los diferentes sectores de la ciudad y dar a conocer el avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en la implementación del proyecto SEPT.	PAUTA PUBLICITARIA	1.750.000.00

43	043	Pauta institucional en programas radiales que permita impulsar en la comunidad el cuidado de cada una de las obras que la empresa Amable esta culminando en los diferentes sectores de la ciudad y dar a conocer el avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en la implementación del proyecto SEPT.	PAUTA PUBLICITARIA	1.750.000.00
44	044	Pauta Publicitaria en televisión que permita evidenciar la transformación de la ciudad desde el inicio de las obras del proyecto SEPT a la fecha	PAUTA PUBLICITARIA	2.340.000.00
45	045	Pauta Publicitaria en televisión que permita evidenciar la transformación de la ciudad desde el inicio de las obras del proyecto SEPT a la fecha	PAUTA PUBLICITARIA	2.340.000.00
46	046	Pauta Publicitaria en televisión que permita evidenciar la transformación de la ciudad desde el inicio de las obras del proyecto SEPT a la fecha	PAUTA PUBLICITARIA	2.340.000.00
47	047	Pauta Publicitaria en televisión que permita evidenciar la transformación de la ciudad desde el inicio de las obras del proyecto SEPT a la fecha	PAUTA PUBLICITARIA	2.340.000.00
	TOTAL CONTRATOS: 47	VALOR TOTAL:		204.550.144.00



FOTOS Y MATERIAL PUBLICITARIO Y DE COMUNICACIONES.

Volantes.



Tarjetas de presentación:



Afiches:



Campañas:



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Tarjeta invitación a la inauguración de las obras:

Luz Piedad Valencia Franco, Alcaldesa de Armenia en calidad de presidenta de la Junta Directiva de AMABLE E.I.C.E y la Ingeniera Diana Sánchez Molina, Gerente de AMABLE E.I.C.E

Tienen el gusto de invitarle al acto de entrega de las obras de rehabilitación vial: Villa Hermosa y Manantiales

FECHA: Sábado 29 de septiembre de 2012

LUGAR Y HORA:

Villa Hermosa: Vía principal

Manzana D 2:00 pm

Manantiales: intersección vial,

Manantiales - La Fachada 3:00 pm



Volantes invitación a la comunidad.

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

AMABLE LE CUMPLE A LA CIUDAD

Este próximo 29 de septiembre

Armenia esta invitada a la **inauguración de las rehabilitaciones viales**

Villa Hermosa 2:00pm
Vía principal Manzana D

Manantiales 3:00pm
Intersección entre La Fachada y Manantiales



Evento de entrega de obras.



**INAUGURACIÓN
REHABILITACIÓN VIAL MANANTIALES
VILLA HERMOSA**

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



**INAUGURACIÓN
RENOVACIÓN DE ANDENES Cra 17**



**INAUGURACIÓN
PEP DEL COLISEO DEL CAFÉ**

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



INAUGURACIÓN
REHABILITACIÓN VIAL PRIMERO DE MAYO

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



INAUGURACIÓN PEP MIRADOR DE LA SECRETA

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

PRESENTACIONES GRAFICAS

REGLAS (elementos de socialización)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Amable E.I.C.E. Sistema Estratégico de Transporte Público

El espacio público es de todos... Ayúdanos a protegerlo...

- Cuida y protege los jardines que adornan nuestra ciudad.
- Espera el bus en los puntos indicados.
- Cruza por las cebras peatonales.
- Respeta los espacios diseñados para las personas discapacitadas.
- No arrojes la basura al piso, usa las basureras.

www.armeniaamable.gov.co



LAPICEROS (posicionamiento de imagen)



VOLANTES SOCIALIZACIONES COLEGIOS

Yo soy **Amable**

AMABLE le cambia la cara a la ciudad

- Líneas guía para las personas invidentes.
- Rampas de ascenso y descenso para las personas con movilidad reducida.
- Basureras que ayudan a conservar los andenes y las calles limpias.
- Jardines que adornan nuestra ciudad.
- Bancas para descansar.
- Señales de cultura ciudadana.
- Monumentos que enriquecen culturalmente la ciudad.
- Paraderos con Espacio Público que proporcionan comodidad y seguridad a los ciudadanos.
- Obras diseñadas con principios de inclusión.

Comparta este volante, sea amable con el medio ambiente. Comparta este volante, sea amable con el medio ambiente. Comparta este volante, sea amable con el medio ambiente.



VOLANTE ENTREGA DE OBRAS

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

ENTREGA DE OBRAS AMABLE









SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO
AMABLE le cambia la cara a la ciudad
ARMENIOS Y TURISTAS LA PUEDEN DISFRUTAR
MOVILIDAD EN LA CIUDAD PARA LA COMUNIDAD

Se realizó un diseño que permita integrar un adhesivo teniendo en cuenta las diferentes fechas de entrega de obras desarrolladas durante el 2013 y parte del próximo año.

INFORMABLE N°2

AMABLE le cumple a Armenia...

- Proyecto vial Avenida Montecarlo
- Rehabilitación vial Carrera 14
- Rehabilitación vial barrios: Mercedes del Norte, Villa Andrea, Arcoiris, La Cecilia, La Virginia y Bosques de Pinares
- Renovación de andenes Carrera 17
- Paradero con Espacio Público Mirador de la Secreta
- Paradero con Espacio Público Coliseo del Café
- Paradero con Espacio Público Hospital del Sur
- Rehabilitación vial Avenida Primero de Mayo
- Rehabilitación vial Barrio Manantiales
- Rehabilitación vial Barrio Villa Hermosa
- Rehabilitación vial Carrera 19 tramo sur
- Rehabilitación vial Calle 10 norte
- Renovación de andenes Carrera 16, Carrera 13, Carrera 14 y calles conectoras.
- Rehabilitación vial Carrera 13.








AMABLE E.I.C.E.
 Sistema Estratégico de Transporte Público
 PILAR RUIZ NARANJO
 Coordinadora de redacción
 DIEGO ESTEBAN TORRES GIRALDO.
 Publicidad y Diseño
 CARLOS HUMBERTO HURTADO
 Fotografía

Circulación Gratuita

INFORMABLE N°2
Empresa Colombiana



CARRERA 19 TRAMO SUR CALLE 10 NORTE



MIRADOR P.E.P.

AMABLE le cambia la cara a la ciudad






WWW.ARMENTIAAMABLE.GOV.CO

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
 twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Editorial:
Luz Piedad Valencia Franco
Alcaldesa de Armenia - Presidenta
Junta Directiva Amable.



La recuperación de la carrera 19 de Armenia es una obra amable para la ciudad.

La recuperación en Armenia de la avenida 19 desde la calle 26 hasta la 52, es el compromiso que ocupa actualmente a la administración municipal y a la empresa Amable.

En esa importante obra se invierten 3.374 millones de pesos, recursos provenientes en un 70% de la nación y el 30% restante del municipio.

Con estas obras nos proponemos mejorar las condiciones de movilidad de la capital del Quindío, mediante la modernización de una de las más importantes arterias que tiene la ciudad.

Este es un proyecto puesto en marcha desde hace varias administraciones y en el que los recursos tienen destinación específica, lo que significa que no se pueden utilizar para solucionar otros problemas o necesidades, no estamos malgastando el presupuesto, estamos atendiendo y superando las dificultades de movilidad de la capital del Quindío, ese es nuestro compromiso.

Esta es una maravillosa oportunidad que no podemos desaprovechar, por más que existan otras necesidades, esta obra la debemos hacer.

Editorial:
Diana Sánchez Molina
Gerente Amable.



Amable: un socio estratégico para la comunidad.

Hacer parte de un proyecto de la magnitud del de AMABLE, es uno de los grandes retos que mi profesión como ingeniera, indiscutiblemente me otorgaron, pero más que eso, el hecho de contribuir con el cambio que paulatinamente va teniendo la ciudad, con el compromiso denodado de todo el equipo de profesionales de la entidad, es una de las grandes satisfacciones que me llevo.

No se trata de una despedida, se trata de dar un paso al costado para que ese cambio que todos los armenios vieron con sus propios ojos durante el 2012 y parte del 2013, se proyecte hacia el futuro y el proyecto cumpla con lo definido en el Conpes 3572, mapa de ruta que muestra el camino hacia una ciudad ordenada, hermosa, pero sobre todo con infraestructura vial y con parámetros del orden internacional.

Vienen grandes proyectos para hacer de Armenia ese paraíso para invertir, vivir y disfrutar, lema que Luz Piedad Valencia Franco, alcaldesa de la ciudad y presidenta de la Junta Directiva de Amable, posicionó como prioridad en su plan de desarrollo 2012-2015. Estamos consolidando un proceso de planeación para poner al día el proyecto y que los terminales de intercambio, los terminales de ruta, los paraderos con espacio público que faltan y todas las rehabilitaciones viales que están proyectadas, se ejecuten y logremos un cambio que beneficie la comunidad.



Yo soy Amable: un proyecto para forjar jóvenes con cultura ciudadana.

Al terminar las obras en el 2012 y a través de los estudios de satisfacción realizados por el equipo de profesionales del área social y de comunicaciones de AMABLE, se detectó como el común denominador la falta de cultura ciudadana en las obras ejecutadas y en la ciudad en general.



Esto llevó a que el equipo se concentrara en diseñar una estrategia en la que se diera a conocer el uso de los espacios públicos en los diferentes componentes del sistema y en el que los jóvenes de los grados décimos y once de las diferentes instituciones educativas fueran los protagonistas y multiplicadores. Es así como para el 2013, se incluyeron 22 establecimientos entre instituciones educativas y colegios, ubicadas en las áreas de influencia del proyecto y a la fecha se han impactado más de 2500 jóvenes.

Estrategias como estas han permitido crear un canal directo con los jóvenes para conocer qué piensa este grupo de los cambios que están sucediendo en su entorno. Algunas de las cosas importantes encontradas son: la implementación de redes de semaforización nuevas para sitios donde no existen y el tráfico vehicular es complejo, la actualización de rutas a sectores de la ciudad que no cuentan con una y la priorización de los usuarios al momento de definir tarifas de transporte urbano. Así mismo, los jóvenes manifestaron estar de acuerdo con la construcción de una ciudad Amable, con el mejoramiento del mobiliario urbano y con la inclusión de ellos en este tipo de estrategias que los convierten en actores de su propio desarrollo.



Capacitaciones en cultura ciudadana



Interacción con los estudiantes



Adquisición predial: cimientos para la consolidación del proyecto.

Por: Hugo Alberto Gutiérrez

AMABLE E.I.C.E cuenta con un área predial encargada del proceso de adquisición de inmuebles requeridos para la ejecución del proyecto SETP, Sistema Estratégico de Transporte Público, proceso que se lleva a cabo a través de una negociación directa con el propietario, la cual se efectúa por el valor comercial del predio y que son realizados por el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi).

Esto garantiza que no se vulneren los derechos de los poseedores, siempre y cuando se logre un acuerdo de voluntades que se perfecciona según la ley 388 de 1997, con un contrato de promesa de compraventa o con el otorgamiento de una escritura pública.

En caso de no haber acuerdo, transcurridos 30 días después de poner en conocimiento la oferta, se debe iniciar un proceso de expropiación en el cual se paga el valor comercial.



Rehabilitación vial
Avenida Primero de Mayo

Actualmente, se encuentran en curso los diferentes procesos de enajenación voluntaria y expropiación correspondientes a los inmuebles ubicados en el sector de la carrera 20 y la calle 50 en los cuales se realizaron por parte de AMABLE E.I.C.E obras de rehabilitación vial para el 2014.

Es importante destacar, que gracias a la colaboración y comprensión de la comunidad, a la fecha se ha logrado llevar a feliz término la compra de predios a través de la negociación directa y de mutuo acuerdo con los propietarios, a la luz de lo dispuesto por el artículo 58 y subsiguientes de la ley 388 de 1997, permitiéndole a la empresa iniciar obras de manera rápida.



Abogados Gestión predios



Rehabilitaciones viales

O próximas Obras Amable 2013

Circuito 2, incluye: Terminal de transportes, Arenales y Calle 50 entre Carreras 18 y 19.

CIRCUITO TERMINAL (Calle 35 entre cra 19 y 18 y desde la salida del flujo vehicular del terminal incluyendo todas las cuadras del parque Santander y la Calle 36
Valor proyecto: \$2.267.121.303,00
Construcción: \$2.118.804.956,00
Interventoría: \$148.316.347,00
814m

ARENALES (Desde la esquina de la Planta de Premezclados Argos y concluye en la intersección con la carrera 18)
Valor proyecto: \$2.267.121.303,00
Construcción: \$2.118.804.956,00
Interventoría: \$148.316.347,00
612m

CALLE 50 entre carreras 18 y 19
Valor proyecto: \$509.624.318,00
Construcción: \$476.284.409,00
Interventoría: \$33.339.909,00
80m

Alcance en Km: 1,506

REHABILITACIÓN VIAL CALLE 50 DESDE LA CARRETA 19 HASTA LA GLORIETA LOS NARANJOS, INCLUYE RENOVACIÓN DE ANDENES.

Valor proyecto: \$3.506.567.416,00
Construcción: \$3.294.644.674,00
Interventoría: 185.565.585,00
Alcance en Km: 1.15

Circuito 1, incluye: Sagrada Familia. Sector Minorista, Calle 26 entre carreras 18 y 13.

CIRCUITO SAGRADA FAMILIA (Calle 9 entre cra. 14 y 15; Carrera 15 entre cil 9 y 11; Calle 11 entre cra. 15 y 19)
Valor proyecto: \$1.319.995.458,00
Construcción: \$1.233.640.615,00
Interventoría: \$86.354.843,00
632m

CIRCUITO MINORISTA (Inicia en la esquina de la central minorista y termina en la calle 21)
Valor proyecto: \$655.325.190,00
Construcción: \$612.453.499,00
Interventoría: \$42.871.741,00
428 m

CALLE 26 (Desde el inferior de los puentes de la carrera 18 sobre toda la calle 26 y hasta la carrera 13)
Valor proyecto: \$2.488.395.157,00
Construcción: \$2.325.602.950,00
Interventoría: \$162.792.207,00
453 m

Alcance en Km: 1,513

REHABILITACIÓN VIAL DE LA CARRERA 19 TRAMO NORTE.

Valor proyecto: \$10.996.582.932,00
Construcción: \$10.382.309.992,00
Interventoría: \$531.214.460,00
8400m2
Alcance en Km: 3.2



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

<p>Proyectos viales que mejoran la movilidad de la ciudad.</p> <p>Trabajar en diferentes sectores de la ciudad para mejorar la movilidad de la misma, es el empeño de la empresa Amable, con el propósito de cumplir el Proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público, cuyo plazo máximo de ejecución es el 2016. Es por esto, que se definió la ejecución de tres grandes proyectos viales en un primer paquete de obras, las cuales se encuentran descritas a continuación:</p> <p>Rehabilitación vial de la Calle 10 Norte Objeto del Contrato: Rehabilitación vial de la calle 10 norte en desarrollo del SETP Armenia</p> <p>Área rehabilitada: 750 metros cuadrados Valor de la obra: \$1.564.137.094 Constructor: Consorcio Pranha Amable 003 Interventor: Ingeniero Wilmar Humberto López Vélez Duración de la obra: 3 meses 15 días Personal de la región: 97,14%</p>  <p>Fotos obras Calle 10 Norte 10/08/13</p>	<p>Rehabilitación vial de la Carrera 19 Tramo Sur Objeto del Contrato: Rehabilitación vial de la carrera 19 tramo sur en desarrollo del SETP Armenia</p> <p>Área rehabilitada: 10.860 metros cuadrados Valor de la obra: \$3.538.494.420 Constructor: Consorcio Ciudad Milagro 003 Interventor: Consorcio Intervías Amable Duración de la obra: 5 meses Personal de la región: 100%</p> 	<p>Rehabilitación vial y renovación de andenes en diferentes sectores del centro de la ciudad Objeto del Contrato: Rehabilitación vial y renovación de andenes en diferentes sectores del centro de Armenia en desarrollo del SETP de Armenia</p> <p>Área rehabilitada andenes: 14.000 metros cuadrados Área Rehabilitación vial: 4.500 metros cuadrados Valor de la obra: \$5.042.834.782 Constructor: Consorcio Renovación Urbana Interventor: Consorcio Caba Ingeniería S.A- WHLY Duración de la obra: 9 meses</p> 	 <p>Estudios y diseños complementarios para los paraderos con espacio público los naranjos, carrera 19 con calle 22 y el terminal de ruta aeropuerto, dentro del sistema estratégico de transporte público SETP de Armenia.</p> 
			

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
 twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

3. SITUACION DE LOS RECURSOS A. RECURSOS FINANCIEROS B. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

A. RECURSOS FINANCIEROS

APORTES DEL MUNICIPIO.

Desde el 2012 al 05 de noviembre de 2015, se han recibido Aportes por parte del Municipio de Armenia para el Sistema Estratégico de Transporte Público, según se relaciona a continuación

AÑO	CONPES NACIÓN	APORTES NACIÓN	AÑO	CONPES MUNICIPIO	APORTES MUNICIPIO
2009	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.502	\$ 2.869
2010	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.502	\$ 15.192
2011	\$ 11.909	\$ 11.909	\$ 0	\$ 8.502	\$ 6.579
2012	\$ 20.659	\$ 20.659	\$ 0	\$ 8.502	\$ 9.088
2013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.919	\$ 8.386
2014	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.247	\$ 4.581
2015	\$ 31.534	\$ 0	\$ 0	\$ 4.609	\$ 7.132
2016	\$ 30.011	\$ 0	\$ 0	\$ 3.954	\$ 0
2017	\$ 33.789	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2018	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2019	\$ 10.842	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2020	\$ 10.842	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 149.586	\$ 32.568	\$ 0	\$ 53.737	\$ 53.827

RECURSOS DEL CRÉDITO.

SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO - AMABLE ESTADO DEUDA

ENTIDAD	VALOR APROBADO	DESEMBOLSOS	EJECUTADO	DISPONIBLE	PENDIENTE DESEMBOLSO	ESTADO CREDITO (DESEMBOLSOS)
BBVA	10.000.000.000,00	3.500.000.000,00	3.419.544.119,72	80.455.880,28	6.500.000.000,00	CANCELADO
BANCO DE BOGOTA	48.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000.000,00	
TOTAL	58.000.000.000,00	3.500.000.000,00	3.419.544.119,72	80.455.880,28	54.500.000.000,00	

En el mes de diciembre de 2012 se cancelaron los créditos que se habían contraído con el BBVA uno por \$1.500.000.000.00 y el otro por \$2.000.000.000.00, dichos créditos fueron cancelados con recursos recibidos por la Nación.

Bienes Muebles e Inmuebles

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año <u>2012 - 2015</u> Comprendida entre el día <u>01</u> del mes <u>ENERO</u> y el día <u>31</u> del mes <u>OCTUBRE</u>	
Terrenos	
Edificaciones	\$ 0.00
Construcciones en curso	
Maquinaria y Equipo	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	
Equipos de Comunicación y Computación	\$ 67.939.135.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$ 15.144.884.00
Bienes Muebles en Bodega	
Redes, Líneas y Cables	
Plantas, Ductos y Túneles	
Otros Conceptos	

- Inventario Bienes : Se anexa el Inventario de bienes muebles y el
- Inventario Gestión Documental: Se anexa (formato 5)

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

4. PLANTA DE PERSONAL

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

4. PLANTA DE PERSONAL:

Detalle de la planta de personal de la Entidad.

CONCEPTO	TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de libre nombramiento y remoción:			
A la fecha de inicio de la gestión	3*	3	0
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	3*	2	1
Variación porcentual	100%	75%	
Cargos de Carrera Administrativa:			
A la fecha de inicio de la gestión	0	0	0
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	0	0	0
Variación porcentual	0%	0%	

***NOTA:** La Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal cuenta con tres (3) funcionarios a su servicio, los cuales asumen en calidad de Gerente, y Subgerente y Asesor de Control Interno. Estos funcionarios no perciben salarios o prestaciones con cargo al proyecto SETP, estos son asumidos por la Empresa AMABLE E.I.C.E., mediante recursos que el municipio aporta diferentes al proyectos para gastos de funcionamiento.

El personal vinculado con el desarrollo del proyecto SETP en el periodo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 ha sido vinculado mediante contratos de consultoría, de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con cargo a los aportes del municipio en acatamiento del convenio de cofinanciación suscrito con la nación (numeral 2.3 literal E y numeral 4.2 literal A).

- Organigrama: Se anexa
- Relación de Personal:

Nombre	Cédula Ciudadanía. No.	Cargo	Fecha Vinculación	Sitio Ubicación Laboral	Tipo Vinculación
Mauricio Pedroza Canizales	16.863.602	Gerente	18 junio de 2015	AMABLE E.I.C.E. – EDIF. CAM P.5to.	Libre Nombramiento y Remoción
Vacante		Subgerente		AMABLE E.I.C.E. – EDIF. CAM P.5to.	Libre Nombramiento y Remoción
Yolanda Zamora Perdomo	41.907.069	Asesora Control Interno	02 de enero de 2014	AMABLE E.I.C.E. – EDIF. CAM P.5to.	Libre Nombramiento y Remoción – Por Periodo

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

-



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.


Vigencia Fiscal Año 2012				
NOMBRE DE LA ENTIDAD: 2.6. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
DENOMINACIÓN PROGRAMA / SUBPROGRAMA/ PROYECTO	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")	
POLÍTICA 2. CIUDAD AMABLE PARA LA VIDA PROGRAMA 7. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUBPROGRAMA 3. Desarrollo y mantenimiento de infraestructura vial PROYECTO Mantenimiento de la infraestructura del sistema estratégico de transporte público SETPC	Planificar la movilidad local e implementar el sistema estratégico de transporte público colectivo para Armenia, y su articulación con procesos regionales	X		\$8.000.000.000
NOMBRE DE LA ENTIDAD: 2.7. SECRETARÍA DE TRÁNSITO				
POLÍTICA 2. CIUDAD AMABLE PARA LA VIDA PROGRAMA: 6. MOVILIDAD SOSTENIBLE SUBPROGRAMA: 2. Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo SETPC articulado al desarrollo local LÍNEA DE PROYECTO: 1. Implementación del sistema estratégico de transporte público colectivo SETPC PROYECTO: Estructuración del Sistema Estratégico de Transporte Público	Fortalecer un sistema de transporte público, basado en la operación organizada y moderna, facilitando la movilidad en la ciudad.	X		\$520.000.000

Vigencia Fiscal Año 2013				
NOMBRE DE LA ENTIDAD: 2.6. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
DENOMINACIÓN PROGRAMA / SUBPROGRAMA/ PROYECTO	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")	
POLÍTICA 2. CIUDAD AMABLE PARA LA VIDA PROGRAMA 7. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUBPROGRAMA 3. Desarrollo y mantenimiento de infraestructura vial PROYECTO Mantenimiento de la infraestructura del sistema estratégico de transporte público SETPC	Planificar la movilidad local e implementar el sistema estratégico de transporte público colectivo para Armenia, y su articulación con procesos regionales	X		\$8.000.000.000
NOMBRE DE LA ENTIDAD: 2.7. SECRETARÍA DE TRÁNSITO				

<p>POLÍTICA 2. CIUDAD AMABLE PARA LA VIDA PROGRAMA: 6. MOVILIDAD SOSTENIBLE SUBPROGRAMA: 2. Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo SETPC articulado al desarrollo local LÍNEA DE PROYECTO: 1. Implementación del sistema estratégico de transporte público colectivo SETPC PROYECTO: Estructuración del Sistema Estratégico de Transporte Público</p>	<p>Fortalecer un sistema de transporte público, basado en la operación organizada y moderna, facilitando la movilidad en la ciudad.</p>	<p>X</p>		<p>\$520.000.000</p>
---	---	----------	--	----------------------

Plan de Acción: Se anexa

Seguimiento Plan de Acción: Se anexa



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

6. OBRAS PÚBLICAS

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

6. OBRAS PÚBLICAS:

Nota: Se relación los contratos de Obra Pública, correspondientes al año 2012 A 2015

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR	ESTADO		VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	OBSERVACIONES
			EJECUTADA (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")		
Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 9 del mes FEBRERO y el día 31 del mes DICIEMBRE (Contratación realizada por AMABLE E.I.C.E.)						
Construcción del paradero con espacio publico en el mirador de la secreta y obras complementari as, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP de Armenia"	B&V INGENIERIA SAS.	Ing. Sandra Liliana Molano.	x		\$967.732.673	
Construcción del paradero con espacio publico en el Coliseo del Café y obras complementari as, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP de Armenia	CONSORCIO EL DANUBIO	Ing. Sandra Liliana Molano.	x		\$700.852.071	
Rehabilitación vial de la avenida primero de mayo, en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP – Armenia"	CONSORCIO PRANHA AMABLE 003.	López Vélez Wilmar Humberto	x		\$2.083.282.927	
Rehabilitación vial de la Urbanización Villa Hermosa en desarrollo del Sistema Estratégico de	Consortio Construcciones Civiles 3	Consortio BC	x		\$439.876.203	

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Transporte Público - SETP Armenia"						
Rehabilitación vial de la Urbanización Manantiales - en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP Armenia	JSC CONSORCIO MANANTIALES	Consortio BC	X		\$740.010.687,12	
Renovación de Andenes del Sector Centro - Tramos Carrera 17, entre calles 17 y 21 y calle 16 entre carreras 14 y 16, dentro del desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP de Armenia	Consortio MS 2050	Consortio Caba Ingeniería S.A.S	X		\$687.704.436	

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR	ESTADO		VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	OBSERVACIONES
			EJECUTADA (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")		
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 1 del mes ENERO y el día 31 del mes DICIEMBRE (Contratación realizada por AMABLE E.I.C.E.)						
Rehabilitación vial de la calle 10 Norte, entre la carrera 14 y la carrera 19, en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP - Armenia	CONSORCIO PRANHA AMABLE 002.	López Vélez Wilmar Humberto.	x		\$1.466.085.020,00	
Rehabilitación vial de la carrera 19 Tramo Sur, en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP - Armenia	CONSORCIO CIUDAD MILAGRO 003	Consortio Intervías Amable.	x		\$3.337.030.260,00	
Rehabilitación Vial y Renovación de Andenes en diferentes sectores del Centro de Armenia en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP.	CONSORCIO RENOVACION URBANA.	Consortio Caba Ingeniería SAS - WHLV.	x		\$4.722.534.560,75	
Rehabilitación Vial calle 50 entre la carrera 19 y la glorieta los Naranjos, incluye renovación de andenes en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP - Armenia	CONSORCIO ARMENIA.	Consortio Caba Ingeniería CARMON A CARVAJA L SAS	x		\$3.275.698.691,00	

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

--	--	--	--	--	--	--

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR	ESTADO		VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	OBSERVACIONES
			EJECUTADA (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")		
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 1 del mes ENERO y el día 31 del mes DICIEMBRE (Contratación realizada por AMABLE E.I.C.E.)						
Renovación de Andenes en diferentes sectores del centro de Armenia, tramo 3, en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERÍA SAS	INGENIERÍA Y ESTUDIOS LTDA..	x		\$ 2.088.379.610.00	
Rehabilitación Vial de la Carrera 19 Tramo Norte, en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP Armenia	CONSORCIO CIUDAD MILAGRO 009	CONSORCIO ARMENIA 2014.	x		\$10.756.278.418.00	
Rehabilitación vial de los sectores: Circuito Terminal - Arenales - Calle 50 Entre Carreras 18 y 19, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP - Armenia.	CONSORCIO CONSTRUCIONAL AMABLE 06.	CONSORCIO PROSPERIDAD	x		\$ 4.546.298.183.00	
Rehabilitación Vial de los sectores: Circuito Sagrada Familia - Calle 26 entre carreras 18 y 13 - Sector la Minorista, dentro del Sistema Estratégico de Transporte	CONSORCIO AMABLE - LA MINORISTA.	CONSORCIO WCF INGENIEROS.	x		\$ 4.706.254.917.00	

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Público SETP - Armenia						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR	ESTADO		VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	OBSERVACIONES
			EJECUTADA (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")		
Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 1 del mes ENERO y el día 31 del mes DICIEMBRE (Contratación realizada por AMABLE E.I.C.E.)						
Rehabilitación Vial y Renovación de Andenes en la carrera 18 y conectoras, sector centro de Armenia, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP.	CONSORCIO VIAL CARRERA 18.	CONSORCIO CABANINGENIERÍA WHL - PIEDRAHITA.		x	\$ 6.502.094.240.70	
Rehabilitación vial de la carrera 18 tramo sur desde la calle 50 (incluyendo la intersección) hasta la calle 26 (sin incluir el puente) y renovación de andenes (tramo 4) de la calle 21 entre carreras 14 y 19 en el sector centro de la ciudad en desarrollo del sistema estratégico de transporte público de armenia"	CONSORCIO ARMENIA CENTRO	CONSORCIO CBH - ARMENIA		x	\$9.941.265.676.11	

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

7. EJECUCION PRESUPUESTAL

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

GESTIÓN FINANCIERA

Vigencia 2012

Según Acuerdo No. 010 del 27 de Octubre de 2011 se aprobó el presupuesto de Ingresos, Gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e Inversión de AMABLE E.I.C.E para la vigencia 2012, por valor de \$80.789.000.000; a través de acuerdos de la Junta directiva y resoluciones tanto del COMFIS como interna, el presupuesto se ha modificado a Junio y en diciembre de 2012, para un total de \$49.546.630.711 y ejecutado financieramente a diciembre 31 de 2012 de la siguiente manera:

INGRESOS

Rubro	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecutado	% Ejecutado	Saldo Por Ejecutar	% x Ejecutar
INGRESOS	80.789.000.000	49.546.630.711	33.179.978.438	66,97	16.366.652.273	33,03
DISPONIBILIDAD INICIAL		7.333.086.986	7.333.086.986	100,00	0	0,00
TRANSFERENCIAS Y APORTES	30.226.000.000	42.135.000.000	25.481.219.337	60,48	16.653.780.663	39,52
APORTES NACIONALES	20.659.000.000	32.568.000.000	18.230.969.337	55,98	14.337.030.663	44,02
APORTES MUNICIPALES	9.567.000.000	9.567.000.000	7.250.250.000	75,78	2.316.750.000	24,22
RECURSOS DE CAPITAL	50.563.000.000	78.543.725	365.672.115	465,57	-287.128.390	-365,57

FUNCIONAMIENTO, SERVICIO A LA DEUDA E INVERSION

Rubro	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecutado	% Ejecutado	Saldo Por Ejecutar	% x Ejecutar
GASTOS	80.789.000.000	49.546.630.711	12.031.068.485	24,28	37.515.562.226	75,72
FUNCIONAMIENTO	340.000.000	340.000.000	233.144.707	68,57	106.855.293	31,43
GASTOS DE PERSONAL	231.955.753	231.955.753	205.192.537	88,46	26.763.216	11,54
GASTOS GENERALES	98.044.247	98.044.247	21.292.170	21,72	76.752.077	78,28
TRANSFERENCIAS	10.000.000	10.000.000	6.660.000	66,60	3.340.000	33,40
SERVICIO DE LA DEUDA	2.700.000.000	3.785.000.000	3.773.901.181	99,71	11.098.819	0,29
INVERSION	77.749.000.000	45.421.630.711	8.024.022.597	17,67	37.397.608.114	82,33
PREDIOS	8.197.000.000	3.738.988.463	937.973.697	25,09	2.801.014.766	74,91
RED SEMAFORICA	3.676.000.000	624.855.519	0	0,00	624.855.519	100,00
PROYECTOS VIALES	9.356.000.000	3.979.105.682	0	0,00	3.979.105.682	100,00
REHABILITACION VIAL	25.922.800.000	23.966.404.770	3.520.583.782	14,69	20.445.820.988	85,31
RENOVACION DE ANDENES	12.086.000.000	5.286.558.791	753.168.360	14,25	4.533.390.431	85,75
PARADEROS Y PEP'S	936.000.000	4.993.230.136	1.818.077.963	36,41	3.175.152.173	63,59
TERMINALES Y CAMIS	5.907.200.000	1.662.694.269	0	0,00	1.662.694.269	100,00
SISTEMA DE GESTION	10.525.000.000	0	0	0,00	0	0,00
GERENCIA DEL PROYECTO	1.093.000.000	1.117.115.081	957.538.795	85,72	159.576.286	14,28
COSTOS FINANCIEROS	50.000.000	52.678.000	36.680.000	69,63	15.998.000	30,37

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

En los cuadros anteriores se muestra como en la ejecución de ingresos se ha ejecutado el 66,97% del definitivo, en cuanto a la disponibilidad inicial ya se ejecutó el 100%, las transferencias y aportes se han ejecutado en el 60,48%, por parte de la Nación se realizaron aportes en un 55,98%, y en cuanto a los aportes del ente territorial en un 75,78% de los meses de Enero a Octubre para inversión y funcionamiento a Diciembre; los recursos de capital van en el 75% que pertenecen a rendimientos de operaciones financieras, teniendo en cuenta que ha ingresado más (319%) de lo presupuestado y no se ha utilizado el crédito.

En cuanto a Gastos (funcionamiento, servicio a la deuda, e inversión) se tiene un 24,28% ejecutado y distribuido así:

Funcionamiento el 68,57% donde se tiene los gastos de personal de los funcionarios de planta, gastos generales y transferencias a la contraloría Municipal.

El servicio a la deuda el 99,71% que corresponde al pago de intereses y de capital del crédito realizado en el año 2011 por \$3.500 millones para:

OBRA	VALOR
REHABILITACION VIAL CARRERA 14 (2011)	3.436.102.908
CONSTRUCCION	3.238.153.548
INTERVENTORIA	197.949.360
REHABILITACION VIAL AVENIDA PRIMERO DE MAYO (2012)	50.246.748
CONSTRUCCION	50.246.748
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	13.650.344
TOTAL	3.500.000.000

En cuanto a la inversión presenta una ejecución del 17,67% y los componentes de mayor movimiento son:

- Predios el 25,09% en la compra de propiedades para rehabilitación vial y paraderos en la carrera 20, avenida 19 y calle 50, apoyo jurídico y estudios y avalúos en el proceso de predios.
- Rehabilitación vial con el 14,69% en la construcción e interventoría de barrio Manantiales \$796.683.681, Villa Hermosa \$473.876.203 y Primero de Mayo \$2.250.023.898.
- Renovación de andenes el 14,25% para el sector centro de la ciudad por valor de \$753.168.360.
- Paraderos y PEP'S el 38% en los sectores de la Secreta \$1.050.732.673 y Coliseo \$767.345.290.
- Gerencia del Proyecto el 85,72% contratación del personal para el apoyo técnico y diseño e imagen corporativa y socialización del proyecto;

- Costos financieros el 69,63%.

En conclusión presenta una ejecución financiera de:

CONCEPTO	% EJEC A 31 de DIC DE 2012
INGRESOS	66,97%
FUNCIONAMIENTO	68,57%
SERVICIO A LA DEUDA	99,71%
INVERSION	17,67%

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Vigencia 2013

Según Acuerdo No. 005 del 26 de Octubre de 2012 se aprobó el presupuesto de Ingresos, Gastos de funcionamiento, e Inversión de AMABLE E.I.C.E para la vigencia 2013, por valor de \$66.458.029.823; ejecutado financieramente a septiembre de la presente vigencia de la siguiente manera:

INGRESOS

Rubro	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ingresos Netos 30 Nov	% EJECUC	Saldo Por Ejecutar	% X EJECUC
INGRESOS	66.458.029.823	66.458.029.823	26.191.600.857	39,41	40.266.428.966	60,59
DISPONIBILIDAD INICIAL	37.405.029.823	37.405.029.823	23.576.558.482	63,03	13.828.471.341	36,97
TRANSFERENCIAS Y APORTES	28.665.000.000	28.665.000.000	2.615.042.375	9,12	26.049.957.625	90,88
APORTES NACIONALES	21.684.000.000	21.684.000.000	0	0,00	21.684.000.000	100,00
APORTES MUNICIPALES	6.981.000.000	6.981.000.000	2.615.042.375	37,46	4.365.957.625	62,54
RECURSOS DE CAPITAL	388.000.000	388.000.000	0	0,00	388.000.000	100,00

Cuadro De Desembolso Municipio – Nación

APORTANTE	V/CONPES 2009	V/CONPES 2013	APORTES 2013 PESOS CO/TES	% APORTADO 2013
MUNICIPIO	53.727	55.708	39.237	70,43%
NACIÓN	125.366	146.521	18.231	12,44%
TOTAL	179.093	202.229	56.561	27,97%

Nota: cuadro en millones de pesos

FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

Rubro	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecutado	% Ejec	Saldo por Ejecutar	% x Ejec
GASTOS	66.458.029.823	66.425.207.955	5.032.377.919	7,58%	51.467.747.892	77,48%
FUNCIONAMIENTO	360.000.000	360.000.000	197.849.080	54,96%	158.473.263	44,02%
GASTOS DE PERSONAL	306.826.652	285.826.652	169.077.397	59,15%	116.749.255	40,85%
GASTOS GENERALES	46.173.348	67.173.348	22.355.020	33,28%	41.140.671	61,25%
TRANSFERENCIAS	7.000.000	7.000.000	6.416.663	91,67%	583.337	8,33%
INVERSIÓN	66.098.029.823	66.065.207.955	4.834.528.839	7,32%	51.309.274.629	77,66%

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

PREDIOS	1.535.000.000	1.535.000.000	53.317.921	3,47%	1.446.533.958	94,24%
RED SEMAFORICA	4.452.229.296	4.150.656.066	0	0,00%	4.150.656.066	100,00%
PROYECTOS VIALES	7.580.000.000	7.580.000.000	0	0,00%	7.580.000.000	100,00%
REHABILITACION VIAL	31.273.367.709	31.253.755.399	3.378.747.024	10,81%	22.740.082.945	72,76%
RENOVACION DE ANDENES	14.645.206.048	14.631.996.490	730.424.211	4,99%	9.425.109.462	64,41%
PARADEROS Y PEP'S	2.684.300.000	2.684.300.000	0	0,00%	2.684.300.000	100,00%
TERMINALES Y CAMIS	2.135.500.000	2.135.500.000	0	0,00%	2.135.500.000	100,00%
SISTEMA DE GESTION	358.426.770	660.000.000	0	0,00%	660.000.000	100,00%
GERENCIA DEL PROYECTO	1.383.000.000	1.383.000.000	660.249.683	47,74%	447.882.198	32,38%
COSTOS FINANCIEROS	51.000.000	51.000.000	11.790.000	23,12%	39.210.000	76,88%

En los cuadros anteriores se muestra como en la ejecución de ingresos se ha ejecutado el 39,41% del definitivo, en cuanto a la disponibilidad inicial se ha ejecutado el 63,03%, las transferencias y aportes se han ejecutado en el 9,12%; por parte de la Nación no se han realizado aportes en la presente vigencia, y en cuanto a los aportes del ente territorial en un 37,46%; los recursos de capital no se han ejecutado a la fecha

En cuanto a Gastos (funcionamiento, servicio a la deuda, e inversión) se tiene un 7.58% ejecutado y distribuido así:

Funcionamiento el 54,96% donde se tiene los gastos de personal de los funcionarios de planta, gastos generales y transferencias a la contraloría Municipal.

En cuanto a la inversión presenta una ejecución del 7.32% y los componentes de mayor movimiento son:

- Predios el 3.47%, apoyo jurídico y estudios y avalúos en el proceso de predios, personal que apoya el área.
- Rehabilitación vial con el 10.81% en la rehabilitación de la Calle 10N y la Carrera 19 Sur, Rehabilitación Vial Centro
- Renovación de Andenes 4.99%, correspondiente al Contrato del centro de la ciudad
- Gerencia del Proyecto el 47.74% contratación del personal para el apoyo técnico y diseño e imagen corporativa y socialización del proyecto;
- Costos financieros el 23,12%.

En conclusión presenta una ejecución financiera de:

CONCEPTO	% EJEC A 22 de AGOSTO
----------	-----------------------

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

	DE 2013
INGRESOS	39,41%
FUNCIONAMIENTO	54,96%
INVERSION	7.32%

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Según Acuerdo No. 007 del 11 de diciembre de 2013 se aprobó el presupuesto de Ingresos, Gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e Inversión de AMABLE E.I.C.E para la vigencia 2014, por valor de \$63.287.654.466 a través de acuerdo de la Junta directiva y resoluciones tanto del COMFIS como interna, el presupuesto se ha modificado en el mes de febrero de 2014, para un total de \$41.603.654.466 quedando de la siguiente manera:

INGRESOS A DICIEMBRE 2014

Rubro	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecutado	% Ejecutado	Saldo Por Ejecutar	% x Ejecutar
INGRESOS	63.287.654.466	41.603.654.466	39.327.666.422	94.53	2.275.988.044	5.47
DISPONIBILIDAD INICIAL	27.842.409.297	6.158.409.297	6.573.698.422	106.74	-415.289.125	-6.74
VIGENCIAS FUTURAS CUENTAS POR PAGAR	28.635.673.453	28.635.673.453	27.509.364.372	96.07	1.126.309.081	3.93
TRANSFERENCIAS Y APORTES	6.476.571.716	6.476.571.716	4.953.465.633	76.02	1.553.106.083	23.98
APORTES NACIONALES						
APORTES MUNICIPALES	6.476.571.716	6.476.571.716	4.953.465.633	76.02	1.553.106.083	23.98
RECURSOS DE CAPITAL	333.000.000	333.000.000	321.137.994	96.44	11.862.006	3.56

EJECUCIÓN GASTOS E INVERSIÓN

Rubro	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecutado	% Ejecutado	Saldo Por Ejecutar	% x Ejecutar
GASTOS	63.287.654.466	41.603.654.466	29.589.389.766	71.12	12.014.264.700	28.88
FUNCIONAMIENTO	374.000.000	374.000.000	296.420.516	79.267	77.579.484	20.74
GASTOS DE PERSONAL	332.643.743	285.284.532	242.059.465	84.85	43.225.067	15.15
GASTOS GENERALES	34.076.257	81.435.468	47.081.051	57.81	34.354.4172	42.19
TRANSFERENCIAS	7.280.000	7.280.000	7.280.000	100.00	0	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA						
INVERSION	62.913.654.466	41.229.654.466	29.292.969.250	71.05	11.936.685.2163	28.95
PREDIOS	1.889.400.000	1.283.429.000	94.631.653	7.376	1.188.797.347	92.63
RED SEMAFORICA	5.969.779.379	351.052.909	74.785.200	21.30	279.267.7099	78.70
PROYECTOS VIALES	7.595.000.000	879.557.860	0	0.00	879.557.860	100.00
REHABILITACION VIAL	28.762.526.508	27.244.050.878	21.459.061.966	78.77	5.784.988.912	21.23
RENOVACION DE ANDENES	10.653.359.588	8.760.200.819	6.284.549.156	71.74	2.475.651.663	28.26
PARADEROS Y PEP'S	3.751.969.440	48.500.000	28.013.040	57.76	20.486.960	42.24
TERMINALES Y CAMIS	2.182.619.551	19.000.000	18.675.360	98.29	324.640	1.71
SISTEMA DE GESTION	660.000.000	1.194.863.000	0	0.00	1.194.863.000	100.00
GERENCIA DEL PROYECTO	1.396.000.000	1.396.000.000	1.296.292.875	92.86	99.707.125	7.14
COSTOS FINANCIEROS	53.000.000	53.000.000	36.960.000	69.74	16.040.000	30.26

En los cuadros anteriores se muestra como en la ejecución de ingresos se ejecutó el 94.53% del definitivo, en cuanto a la disponibilidad inicial ya se ejecutó el 100%, las transferencias y aportes se ejecutó en el 76.48%, por parte de la Nación no se recibieron aportes y en cuanto a los aportes del ente territorial en un 76.48%; los recursos de capital van en el 96.44% que pertenecen a rendimientos de operaciones financieras.

En cuanto a Gastos (funcionamiento, servicio a la deuda, e inversión) se tiene un 71.12% ejecutados y distribuido así:

Funcionamiento el 79.26% donde se tiene los gastos de personal de los funcionarios de planta, gastos generales y transferencias a la contraloría Municipal, es de anotar que su baja ejecución se debe en parte a que desde el mes de julio no se cuenta con Gerente de planta

En cuanto a la inversión presenta una ejecución del 71.05% y los componentes de mayor movimiento son:

Predios el 7.37% , apoyo jurídico y estudios y avalúos en el proceso de predios.

Red Semafórica el 21.30%

Rehabilitación vial con el 78.77% en la construcción e interventoría.

Renovación de andenes el 71.74% para el sector centro de la ciudad

Paraderos y PEP'S 57.76%

Terminales y CAMIS el 98.29%

Gerencia del Proyecto el 92.86% contratación del personal para el apoyo técnico y diseño e imagen corporativa y socialización del proyecto;

Costos financieros el 69.74%.

En conclusión presenta una ejecución financiera de:

CONCEPTO	% EJEC A 31 DE DICIMBRE DE 2014
INGRESOS	94.53%
FUNCIONAMIENTO	79.26%
SERVICIO A LA DEUDA	0.00%
INVERSION	71.05%



Vigencia 2015

Según Acuerdo No. 004 del 25 de noviembre de 2014 se aprobó el presupuesto de Ingresos, Gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e Inversión de AMABLE E.I.C.E para la vigencia 2015, por valor de \$52.105.803.966 a través de acuerdo de la Junta directiva y Acta del COMFIS, quedando de la siguiente manera

INGRESOS A DICIEMBRE 2015

Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Ejecutado Periodo	Ejecutado Acumulado	% Ejecutado	Saldo Por Ejecutar	% x Ejecutar
INGRESOS	52.105.803.966	-259.453.905	51.846.350.061	118.731.855	15.994.669.507	31	35.851.680.553	69
DISPONIBILIDAD INICIAL	11.561.171.815	-370.525.363	11.190.646.452	0	11.561.171.815	103	-370.525.363	-3
VIGENCIAS FUTURAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS Y APORTES	37.496.960.000	0	37.496.960.000	64.826.666	4.131.747.812	11	33.365.212.188	89
APORTES NACIONALES	31.534.000.000	0	31.534.000.000	0	0	0	31.534.000.000	100
APORTES MUNICIPALES	5.962.960.000	0	5.962.960.000	64.826.666	4.131.747.812	69	1.831.212.188	31
RECURSOS DE CAPITAL	3.047.672.151	111.071.458	3.158.743.609	53.905.189	301.749.880	10	2.856.993.729	90
RECURSOS DEL CRÉDITO	2.907.672.151	0	2.907.672.151	0	0	0	2.907.672.151	100
RENDIMIENTOS DE OPERACIONES	140.000.000	111.071.458	251.071.458	53.905.189	301.749.880	120	-50.678.422	-20

EJECUCIÓN GASTOS E INVERSIÓN A DICIEMBRE 2015

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03 24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Ejecutado Periodo	Ejecutado Acumulado	% Ejecutado	Saldo Por Ejecutar	% x Ejecutar
GASTOS	52.105.803.966	-259.453.905	51.846.350.061	8.284.779.641	10.729.113.104	21	41.117.236.957	79
FUNCIONAMIENTO	388.960.000	455.441.806	844.401.806	174.936.731	666.942.387	79	177.459.420	21
GASTOS DE PERSONAL	355.746.174	-5.000.000	350.746.174	158.115.667	215.541.909	61	135.204.265	39
GASTOS GENERALES	25.642.626	5.000.000	30.642.626	12.404.533	15.998.366	52	14.644.260	48
TRANSFERENCIAS	7.571.200	455.441.806	463.013.006	4.416.521	435.402.112	94	27.610.894	6.
SERVICIO DE LA DEUDA	0		0	0	0	0	0	0.00
INVERSION	51.716.843.966	-714.895.712	51.001.948.254	8.109.842.910	10.062.170.717	20	40.939.777.537	80
PREDIOS	2.925.429.000	-554.355.363	2.371.103.637	423.112.005	507.028.743	21	1.864.074.893	79
RED SEMAFORICA	4.275.813.856		4.275.813.856	174.498.800	174.498.800	4	4.101.315.056	96
PROYECTOS VIALES	11.413.794.600	736.760.102	12.150.554.702	82.041.000	82.041.000	1	12.068.513.702	99
REHABILITACION VIAL	22.766.329.459	-588.235.937	22.178.093.522	5.583.508.957	5.721.986.693	26	16.456.106.829	74
RENOVACION DE ANDENES	5.844.093.537		5.844.093.537	903.950.255	2.297.295.304	39	3.546.798.233	76.1661
PARADEROS Y PEP'S	1.711.321.954		1.711.321.954	0	0	0.00	1.711.321.954	100.00
TERMINALES Y CAMIS	150.000.000		150.000.000	0	0	0.00	150.000.000	100.00
SISTEMA DE GESTION	1.195.061.560		1.195.061.560	119.392.931	179.089.397	15	1.015.972.163	85
GERENCIA DEL PROYECTO	1.385.000.000	-309.094.513	1.075.905.487	804.008.462	1.064.791.530	99	11.113.957	1
COSTOS FINANCIEROS	50.000.000		50.000.000	19.330.500	35.439.250	71	14.560.750	29

En los cuadros anteriores se muestra la ejecución de ingresos que va ejecutado en el 31% del presupuesto definitivo, el comportamiento de la ejecución se presenta así: Disponibilidad inicial se ejecutó el 100%, **TRANSFERENCIAS Y APORTES** se ha ejecutado en el 11%, dicha ejecución corresponde al **Aporte del Ente Territorial** el cual lleva un 69% del valor que debe girar para la vigencia; **LOS RECURSOS DE CAPITAL** van en el 10% del total y que pertenecen a **Recursos del Crédito – Rendimientos 0%** dicha ejecución no presenta movimiento por que no se ha requerido el crédito, **rendimientos de operaciones financieras** presenta un 120%, el cambio en el porcentaje de ejecución se debe a las modificaciones que se realizaron al presupuesto relacionado con los rendimientos financieros .

En cuanto a Gastos (funcionamiento, servicio a la deuda, e inversión) se tiene un 8.70% ejecutados y distribuido así:

Funcionamiento el 79% donde se tiene: Los **GASTOS DE PERSONAL 61%**, corresponde al pago de los funcionarios de planta que a la fecha se cuenta solo con Gerente y Asesor de Control Interno, se encuentra vacante desde el 18 de junio de 2015 el cargo de subgerente, **GASTOS GENERALES 52%** corresponde a los gastos generados para la adquisición de bienes y suministros, y a comunicación y transporte (Celulares y correspondencia); **TRANSFERENCIAS 94%** corresponde a los pagos

que se le realiza a la contraloría Municipal, igualmente mediante modificación realizada al presupuesto que se ajustaron las transferencias, para realizar la devolución de los Rendimientos financieros resultado de los aportes por recursos del SGP al municipio.

En cuanto a la inversión presenta una ejecución del 20% y los componentes de mayor movimiento son:

Predios el 21% , apoyo jurídico y estudios y avalúos en el proceso de predios.

Red Semafórica el 4%; Proyectos viales con el 1%, contrato consultoría para diseños; Rehabilitación vial con el 26% en la construcción e interventoría.; Renovación de andenes el 39% para el sector centro de la ciudad, Sistema de Gestión 15%, Gerencia del Proyecto el 99% contratación del personal para el apoyo técnico y diseño e imagen corporativa y socialización del proyecto; Costos financieros el 71%.



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

8. CONTRATACION





8. CONTRATACIÓN:

Nota: Se relacionan los contratos de prestación de servicios profesionales, apoyo a la gestión, consultoría, compraventa, transporte, suministros y Licitaciones correspondientes a los años 2012 - 2015.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año <u>2012</u> Comprendida entre el día <u>1</u> del mes <u>ENERO</u> y el día <u>31</u> del mes <u>DICIEMBRE</u> CONTRATACION REALIZADA POR AMABLE				
Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales		45	\$616.674.760,00
	Prestación de Servicios de Consultoría		6	\$393.044.773,24
	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión		9	\$34.540.000,00
	Prestación de Servicios de Publicidad		55	\$93.799.968,00
	Contratos de Suministro		5	\$ 44.670.386,00
Proceso Licitatorio	"Construcción del paradero con espacio público en el mirador de la secreta y obras complementarias, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP de Armenia		1	\$967.732.673,00
	"Construcción del paradero con espacio público en el Coliseo del Café y obras complementarias, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP de Armenia		1	\$700.852.071,00
	Rehabilitación vial de la avenida primero de mayo, en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP - Armenia"		1	\$2.083.282.927,00
	"Rehabilitación vial de la Urbanización Villa Hermosa en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP - Armenia"		1	\$439.876.203,00
	Rehabilitación vial de la Urbanización Manantiales - en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP - Armenia		1	\$740.010.687,12
	Renovación de Andenes del Sector Centro - Tramos Carrera 17, entre calles 17 y 21 y calle 16 entre carreras 14 y 16, dentro del desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP de Armenia		1	\$687.704.436,00

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de Pesos)
---------------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03 24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 1º del mes ENERO y el día 31 del mes DICIEMBRE CONTRATACION REALIZADA POR AMABLE E.I.C.E				
Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales		55	\$799.171.001,00
	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión		11	\$ 47.202.666,00
	Prestación de Servicios de Consultoría		4	\$818.561.052,80
	Contratos de Suministro		3	\$ 35.070.088.00
	Contratos de Compraventa		4	\$ 22.911.500.00
	Prestación de Servicios de Publicidad		38	\$ 123.617.326,00
Proceso Licitatorio	Rehabilitación vial de la calle 10 Norte, entre la carrera 14 y la carrera 19, en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP - Armenia		1	\$1.466.085.020,00
	Rehabilitación vial de la carrera 19 Tramo Sur, en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP - Armenia		1	\$3.337.030.260,00
	Rehabilitación Vial y Renovación de Andenes en diferentes sectores del Centro de Armenia en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP.		1	\$4.722.534.560,75
	Rehabilitación Vial calle 50 entre la carrera 19 y la glorieta los Naranjos, incluye renovación de andenes en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP - Armenia		1	\$3.275.698.691,00

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 1º del mes ENERO y el día 31 del mes DICIEMBRE CONTRATACIÓN REALIZADA POR AMABLE E.I.C.E				
Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales		64	\$1.063.574.003,00
Contratación Directa	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión		23	\$ 91.558.334,00
Concurso de méritos	Prestación de Servicios de Consultoría		6	\$1.825.567.540.00
Mínima cuantía	Contratos de Suministro		4	\$ 39.977.000.00
Mínima cuantía	Contratos de Compraventa		5	\$ 47.487.394.00
Mínima cuantía	Prestación de Servicios de Publicidad		47	\$ 204.550.144,00
Proceso Licitatorio	Renovación de Andenes en diferentes sectores del centro de Armenia, tramo 3, en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público		1	\$2.088.379.610.00

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03 24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

	SETP			
	Rehabilitación Vial de la Carrera 19 Tramo Norte, en desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP Armenia		1	\$10.756.278.418.00
	Rehabilitación vial de los sectores: Circuito Terminal - Arenales - Calle 50 Entre Carreras 18 y 19, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP - Armenia		1	\$4.546.298.183.00
	Rehabilitación Vial de los sectores: Circuito Sagrada Familia - Calle 26 entre carreras 18 y 13 - Sector la Minorista, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP - Armenia		1	\$4.706.254.917.00

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 1º del mes ENERO y el día 31 del mes OCTUBRE CONTRATACIÓN REALIZADA POR AMABLE E.I.C.E				
Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales	92	57	\$1.130.487.383,00
Contratación Directa	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	15	10	\$ 85.630.000,00
Concurso de méritos	Prestación de Servicios de Consultoría	5	1	\$1.804.285.640.00
Mínima cuantía	Contratos de Suministro	2		\$ 18.729.000.00
Mínima cuantía	Contratos de Compraventa		1	\$ 10.454.471.00
Mínima cuantía	Prestación de Servicios de Publicidad		0	\$ 0,00
Proceso Licitatorio	Rehabilitación Vial y Renovación de Andenes en la carrera 18 y conectoras, sector centro de Armenia, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP.	1		\$ 6.502.094.240.70

Listados Contractuales: Se anexa listados



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

9. REGLAMENTOS Y MANUALES



9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Relacione a la fecha de retiro, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la dependencia.

Nota: Se Adjunta copia de los formatos que se están elaborando para los Manuales en medio físico y medio magnético, Un (1) CD.

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Código de Ética	Requisitos establecidos en la norma NTCGP 1000:2.009, Decreto 3622 del 10 de octubre de 2005 y la norma MECI 1000:2005	Resolución 011 del 2010.	Resolución 011 del 2010.	Adopción: 28 Octubre de 2010 Versión 001. Vigente: Noviembre 30 2010 Versión 001.
Manual de Interventoría	Manual de interventoría con el fin de implementar y reglamentar todos los controles y actividades que debe desempeñar el interventor o supervisor de los diferentes tipos de contratos	Documento manual firmado por el Gerente	Versión 001 del 29 de abril de 2011	Adopción: 29 Abril de 2011 Versión 001
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Impulsar el seguimiento visible de la inversión eficiente de los recursos designados al proyecto, que sean destinados al objeto social de la entidad	Documento manual firmado por el Gerente.	Versión 001 del 26 de abril de 2013	Adopción: 26 Abril de 2013 Versión 001
manual de identidad corporativa, visual, verbal del SETP	Imagen Corporativa de la Empresa	Documento entrega contrato 077 de 2010 – Diana Lulú Sáenz Beltrán	Acta Liquidación Final Cto. 077/2010	17 de mayo de 2010
Manual de Contratación	El manual tiene por finalidad la disposición de normas, principios y criterios que regirán la actividad contractual de la Empresa Industrial y Comercial del Estado "AMABLE", del Orden Municipal.	Documento manual se aprobado por la Junta Directiva Versión 001	Versión 001 del 25 de julio de 2012	Adopción: 25 julio de 2013 Versión 001
Estatutos Empresa	Administración y funcionamiento de Amable	Documento manual se aprobado por la Junta Directiva Versión 007	Acuerdo de Junta Directiva No. 006 de 2013 y modif. 002 de 2014	Adopción: 17 junio de 2010 Versión 001



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

10. CONCEPTO GENERAL





10. CONCEPTO GENERAL:

Concepto General Gestión del funcionario que se retira, se separa del cargo o lo ratifican, en forma narrada máximo en dos hojas, sobre la situación administrativa y financiera cumplida durante el período comprendido entre la fecha de inicio de su gestión y la de su retiro o ratificación.

Para dar cumplimiento a la continuación de la ejecución de los proyectos SETP, se debe continuar con la interacción con las Empresas Públicas de Armenia para que ejecuten primero la reposición de redes tanto de acueducto como de alcantarillado para que posteriormente Amable pueda adelantar las rehabilitaciones viales correspondientes y demás obras programadas del Sistema Estratégico de Transporte Público, esta ciudad está supeditada como todas las ciudades amable del país a que se ejecuten prioritariamente estas reposiciones.

La rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro está pendiente de la rehabilitarse, ya que la EPA está gestionando los recursos correspondientes para la construcción de un Alcantarillado paralelo a la Boxcoulvert de la quebrada Armenia.

Es importante señalar que las Empresas Públicas de Armenia y la Administración Municipal están realizando todas las gestiones para poder cumplir con las programaciones de la Empresa Amable E.I.C..E, es así como se ha venido ejecutando las obras en los años 2012 hasta la fecha, sin embargo es de aclarar que se está en espera del recurso que se necesita para la construcción del Alcantarillado paralelo de la carrera 19 centro desde la calle 9 hasta la estación con el fin de poder seguir con las obras PEP carrera 19 con 16 y terminal turístico así como la misma rehabilitación vial, a la fecha ya se realizó la reprogramación de todo el proyecto ajustado hasta el 2016.

Queda entonces una programación de todo el proyecto ajustado, aclarando que se debe tener una coordinación con las empresas prestadoras para lo cual esta gerencia realizó las respectivas reuniones, visitas de campo necesarias y las evaluaciones técnicas para seguir avanzando en el proyecto.

La Administración Municipal ha tenido un verdadero compromiso con relación a la articulación que se debe tener en cuanto a la Secretaría de Infraestructura, Tránsito y Transporte de Armenia, Gobierno, y las empresas de servicios públicos como Empresas Públicas de Armenia, Enelar en su momento; para que se pudieran realizar los avances significativos en el proyecto, lo cual propende en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos tanto en recuperación de movilidad en andenes como en tiempos de desplazamiento y calidad en las vías que se intervienen.

Es necesario entonces que se siga esta coordinación con la Administración Municipal con el fin de que se cumplan con los procesos adquiridos por el Municipio y la Nación, en documento CONPES 3572 de 2009 celebrado con la Nación.

Durante mi gerencia y todo el período de la presente administración, se han realizaron reuniones con funcionarios del BID, donde nos capacitaron para atender el cambio en el proceso de contratación con la entrada en funcionamiento del Empréstito que tiene la Nación con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), con el objetivo de que todos recursos que se desembolsen en adelante se hagan con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo); con el propósito que el proceso de contratación sea enmarcado en los estándares exigidos por el BID a través de la UMUS (Unidad de Movilidad Urbana Sostenible).

COMITES Y ORGANOS ASESORES EN LOS QUE PARTICIPA EL ENTE DESCENTRALIZADO.

JUNTA DIRECTIVA – Reuniones Ordinarias cada tres meses, el (la) Gerente participa con Voz pero sin voto, y actúa como secretario de la Junta si no esta presente el Subgerente.

CONSEJO DE GOBIERNO: Según convocatoria del mandatario municipal, la participación del Gerente es Indelegable.

COMITÉ FIDUCIARIO DEL PROYECTO SETP: Convocado por la Fiduciaria par reunión ordinaria cada tres meses. El (la) Gerente hace parte integral del comité.

LISTADO DE ACCIONES JUDICIALES

NUMERO DE RAMA JUDICIAL (23 dígitos)	fecha de Radicación	Demandante o Tuteante	Apoderado del Demandante	Clase de Proceso	Acción o Medio de control
63-001-3333-003-2015-00308-00		JHON FREDY OROZCO Y OTROS	JHON JAIRO GARCÍA MUÑOZ	Acciones Constitucionales	ACCIÓN POPULAR
63001-3333-752-2013-00047-00		HÉCTOR FABIO VALENCIA QUINTERO y SANTIAGO SÁNCHEZ VESGA como ex integrantes del CONSORCIO VÍAS 2013	JAIME ZULUAGA JARAMILLO	Administrativo	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
63001-3333-755-2014-00278		AMBIENTE ECOLÓGICO SAS Y MARTHA CECILIA CALDERÓN	ÁLVARO ANTONIO RAMÍREZ TOBÓN	Administrativo	REPARACIÓN DIRECTA

PLANES DE MEJORAMIENTO

CONTROL DE GESTIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES VIGENCIA 2013

Hallazgo			Incidencia			Traslado	
No.	Nombre	A	F	Cuantía	S.S	Proc	Fisc
1	Tachones plásticos para delimitación del carril solo bus Carrera 19 tramo sur	X	X	\$5.260.459,46			

Para este hallazgo se tiene en cumplimiento la incidencia fiscal, debido a que está en conjunto con el municipio de Armenia (Alcaldía).

Mediante oficio 1004-0060 del 18 de enero de 2016, "se ordenó CERRAR Y ARCHIVAR la indagación preliminar No. 006 de 2015, aperturada y relacionada con la perdida y deterioro de los tachones plásticos instalados y utilizados para la delimitación del carril solo bus en la Carrera 19 tramo sur entre calle 30 y 50 del municipio de armenia, de conformidad al estudio de las pruebas que soportan la misma, toda vez que no se configuran los elementos suficientes para iniciar procesos de responsabilidad fiscal".

FINANCIERO VIGENCIA 2014

Hallazgo			Incidencia			Traslado	
No.	Nombre	A	F	Cuantía	S.S	Proc	Fisc
1	Inv. Prop. Plana y Eq	X					
2	Deposito Instituciones Financiera	X					

CONTROL DE GESTIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES VIGENCIA 2014

Hallazgo			Incidencia			Traslado	
No.	Nombre	A	F	Cuantía	S.S	Proc	Fisc
1	Contrato de Obra No. 001/2013	X					
2	Contrato de Obra No. 001/2014	X					
3	Contrato de Obra No. 002/2014	X					
4	Contrato de Obra No. 002/2014	X					
5	Contrato de Obra No. 004/2014	X					
6	Rendición de la Cuenta	X					

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03 24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

7	Sostenibilidad Obra Exterior						
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Estos hallazgos se encuentran en cumplimiento.

OTROS:

RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE:

Tal como lo viene realizando la actual administración municipal, se requiere continuidad y atención a las siguientes áreas:

- Financiera:

- El traslado de los aportes del municipio al proyecto SETP oportuna y completamente.
- Destinar aportes financieros adicionales a los aportes del proyecto, para cubrir los gastos de funcionamiento de la empresa.
- Asignar recursos a la EPA para financiar las obras conexas en redes en los sitios de intervención del proyecto SETP
- Promover ante la Nación e giro de mayores recursos para incrementar la actividad de la empresa en nuevas áreas no estimadas por el documento CONPES en el año 2009 y darle cobertura total al Sistema, según el crecimiento de la ciudad.

- Operativas

- Comprometer a las dependencias de la administración municipal en la actividades del proyecto SETP (JURÍDICA, INFRAESTRUCTURA, GOBIERNO, PLANEACIÓN, SETTA).
- Disponer el apoyo técnico profesional en la ejecución de obras a cargo de AMABLE en el espacio público del municipio.
- Garantizar el uso adecuado de las obras construidas por AMABLE
- Establecer el uso adecuado y suficiente para la recepción de escombros producto de las obras de AMABLE y que se evalúe la posibilidad de manejar un horario acorde con las necesidades de las mismas.

- Personal

- Nombrar al Subgerente de la Entidad
- Asignar recursos para fortalecer la planta de personal con profesionales necesarios en la puesta en funcionamiento y operación del sistema
- Nombrar personal para asumir funciones en el centro de control de flota y control semafórico (que instalará) del sistema Estratégico de Transporte Público.

- Recomendar a los inspectores de espacio público, a los profesionales de planeación y funcionarios de SETTA que promuevan en la comunidad el uso adecuado de la infraestructura del SEPT.

- **Comités**

- Asistir a las reuniones y comités de manera prioritaria para garantizar el avance programado del proyecto SETP
- Cumplir con los compromisos asumidos por la administración municipal con el SETP
- Impulsar la articulación de las dependencias de la administración central involucradas en el desarrollo y funcionamiento del SETP (JURÍDICA, PLANEACIÓN)
- Integrar las actividades de EPA con las obras del proyecto SETP, ejecutando de manera coordinada la intervención en redes en las áreas del proyecto SETP

- **Gestión ante la Nación.**

- Visitar los ministerios y el congreso para buscar aportes en un eventual CONPES DE SEGUIMIENTO, que mejore los recursos y brinde mayor cobertura en la infraestructura que requiere el municipio y la sostenibilidad del sistema
- Apoyar la solicitud y entrega oportuna de recursos comprometidos por la nación para la financiación de SETP

- **Socialización**

- Incluir en los boletines de prensa institucional la gestión de la empresa AMABLE y su aporte al plan de desarrollo municipal
- Impulsar a través de los funcionarios y contratistas de la administración el conocimiento popular masivo del proyecto SETP
- Mencionar en todos los escenarios posibles a la empresa AMABLE y el proyecto SETP
- Visitar las obras en ejecución y ejecutadas por la empresa AMABLE para el proyecto SETP
- Invitar al gerente de la entidad a las jornadas de socialización de la gestión municipal.

- **Concejo Municipal**

- Presentar proyectos de acuerdo que permitan el giro de más ingresos para la empresa AMABLE y su vocación de ente operador.
- Promover la creación de a dirección de transporte o asignar a AMABLE como entidad descentralizada la vigilancia de operaciones de transporte público en el municipio

- **Espacio público – vendedores ambulantes**

- Apoyar la conservación del espacio público rehabilitado
 - Conservar libre de ocupación el espacio público peatonal rehabilitado
 - Realizar las tareas de mantenimiento a los andenes y mobiliario dispuesto por la empresa AMABLE
 - Garantizar la ocupación de los módulos en le PEP's
- **Redes de Alcantarillado y otras ESP**
- Gestionar ante la directivas de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, la inversión requerida en sus redes para ejecutar y articular las obras del proyecto SETP
- **Mantenimiento de obras entregadas**
- Vigilar y garantizar el mantenimiento requerido en la infraestructura del SETP
 - Destinar los recursos necesarios para el mantenimiento y conservación de las obras del SETP
- **Operación del Sistema**
- Estimar la necesidad de asignar al ente gestor el manejo y control de la operación del SETP.

FIRMA CORRESPONDIENTE A LOS NUMERALES 1 A 10 DEL ACTA DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005):

Armenia, 25 de enero de 2015

Mauricio Pedroza Canizales
Gerente
RESPONSABLE

Proyecto y Elaboro: Yolanda ZP
